

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和元年6月25日
 至)令和2年3月19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	8月														
	19日 月	20日 火	21日 水	22日 木	23日 金	24日 土	25日 日	26日 月	27日 火	28日 水	29日 木	30日 金	31日 土	1日 日	
事前調査工				夜間施工								夜間施工			
	東有岡㊤ 1622052 1622065 1723030 1822023	東有岡㊤ 1623056 1623902		昆陽 1021043 1121001 1121002 1121020 口酒井 2123015	南本町 1724017 1724018 1724019 1724020 1725011			森本 1920020 1919025 1919026	中央 1521028 1522013 1521048 1521047 御願塚㊤ 1428009 南町 1627022 1528036			東有岡㊤ 1822029 1822028 1822002 1822013			
凡例 昼間施工 夜間施工 															


	地区名		路線No.	事前調査	通行区分	施工日	曜日	備考
1	01 東有岡 [Ⓐ]	1	1622052	昼施工	通行止め	8月19日	月	
2	01 東有岡 [Ⓐ]	2	1622065	昼施工	通行止め	8月19日	月	
14	01 東有岡 [Ⓐ]	14	1723030	昼施工	通行止め	8月19日	月	
15	01 東有岡 [Ⓐ]	15	1822023	昼施工	交互通行	8月19日	月	
5	01 東有岡 [Ⓐ]	5	1623056	昼施工	通行止め	8月20日	火	
6	01 東有岡 [Ⓐ]	6	1623902	昼施工	通行止め	8月20日	火	
32	04 口酒井	1	2123015	夜施工	交互通行	8月22日	木	
38	06 昆陽	4	1021043	夜施工	車線減少	8月22日	木	
39	06 昆陽	5	1121001	夜施工	車線減少	8月22日	木	
40	06 昆陽	6	1121002	夜施工	車線減少	8月22日	木	
41	06 昆陽	7	1121020	夜施工	車線減少	8月22日	木	
19	02 南本町	4	1724017	夜施工	通行止め	8月23日	金	
20	02 南本町	5	1724018	夜施工	通行止め	8月23日	金	
21	02 南本町	6	1724019	夜施工	通行止め	8月23日	金	
22	02 南本町	7	1724020	夜施工	通行止め	8月23日	金	
23	02 南本町	8	1725011	夜施工	通行止め	8月23日	金	
29	03 森本	4	1920020	昼施工	交互通行	8月26日	月	
30	03 森本	5	1919025	昼施工	交互通行	8月26日	月	
31	03 森本	6	1919026	昼施工	交互通行	8月26日	月	
33	05 中央	1	1521028	昼施工	交互通行	8月27日	火	
34	05 中央	2	1522013	昼施工	通行止め	8月27日	火	
34	05 中央	2	1521048	昼施工	通行止め	8月27日	火	
34	05 中央	2	1521047	昼施工	通行止め	8月27日	火	
65	10 御願塚 [Ⓐ]	8	1428009	昼施工	通行止め	8月27日	火	
66	11 南町	1	1627022	昼施工	通行止め	8月27日	火	
68	11 南町	3	1528036	昼施工	通行止め	8月27日	火	
15	01 東有岡 [Ⓐ]	15	1822029	夜施工	交互通行	8月30日	金	
15	01 東有岡 [Ⓐ]	15	1822028	夜施工	交互通行	8月30日	金	
15	01 東有岡 [Ⓐ]	15	1822002	夜施工	交互通行	8月30日	金	
15	01 東有岡 [Ⓐ]	15	1822013	夜施工	交互通行	8月30日	金	

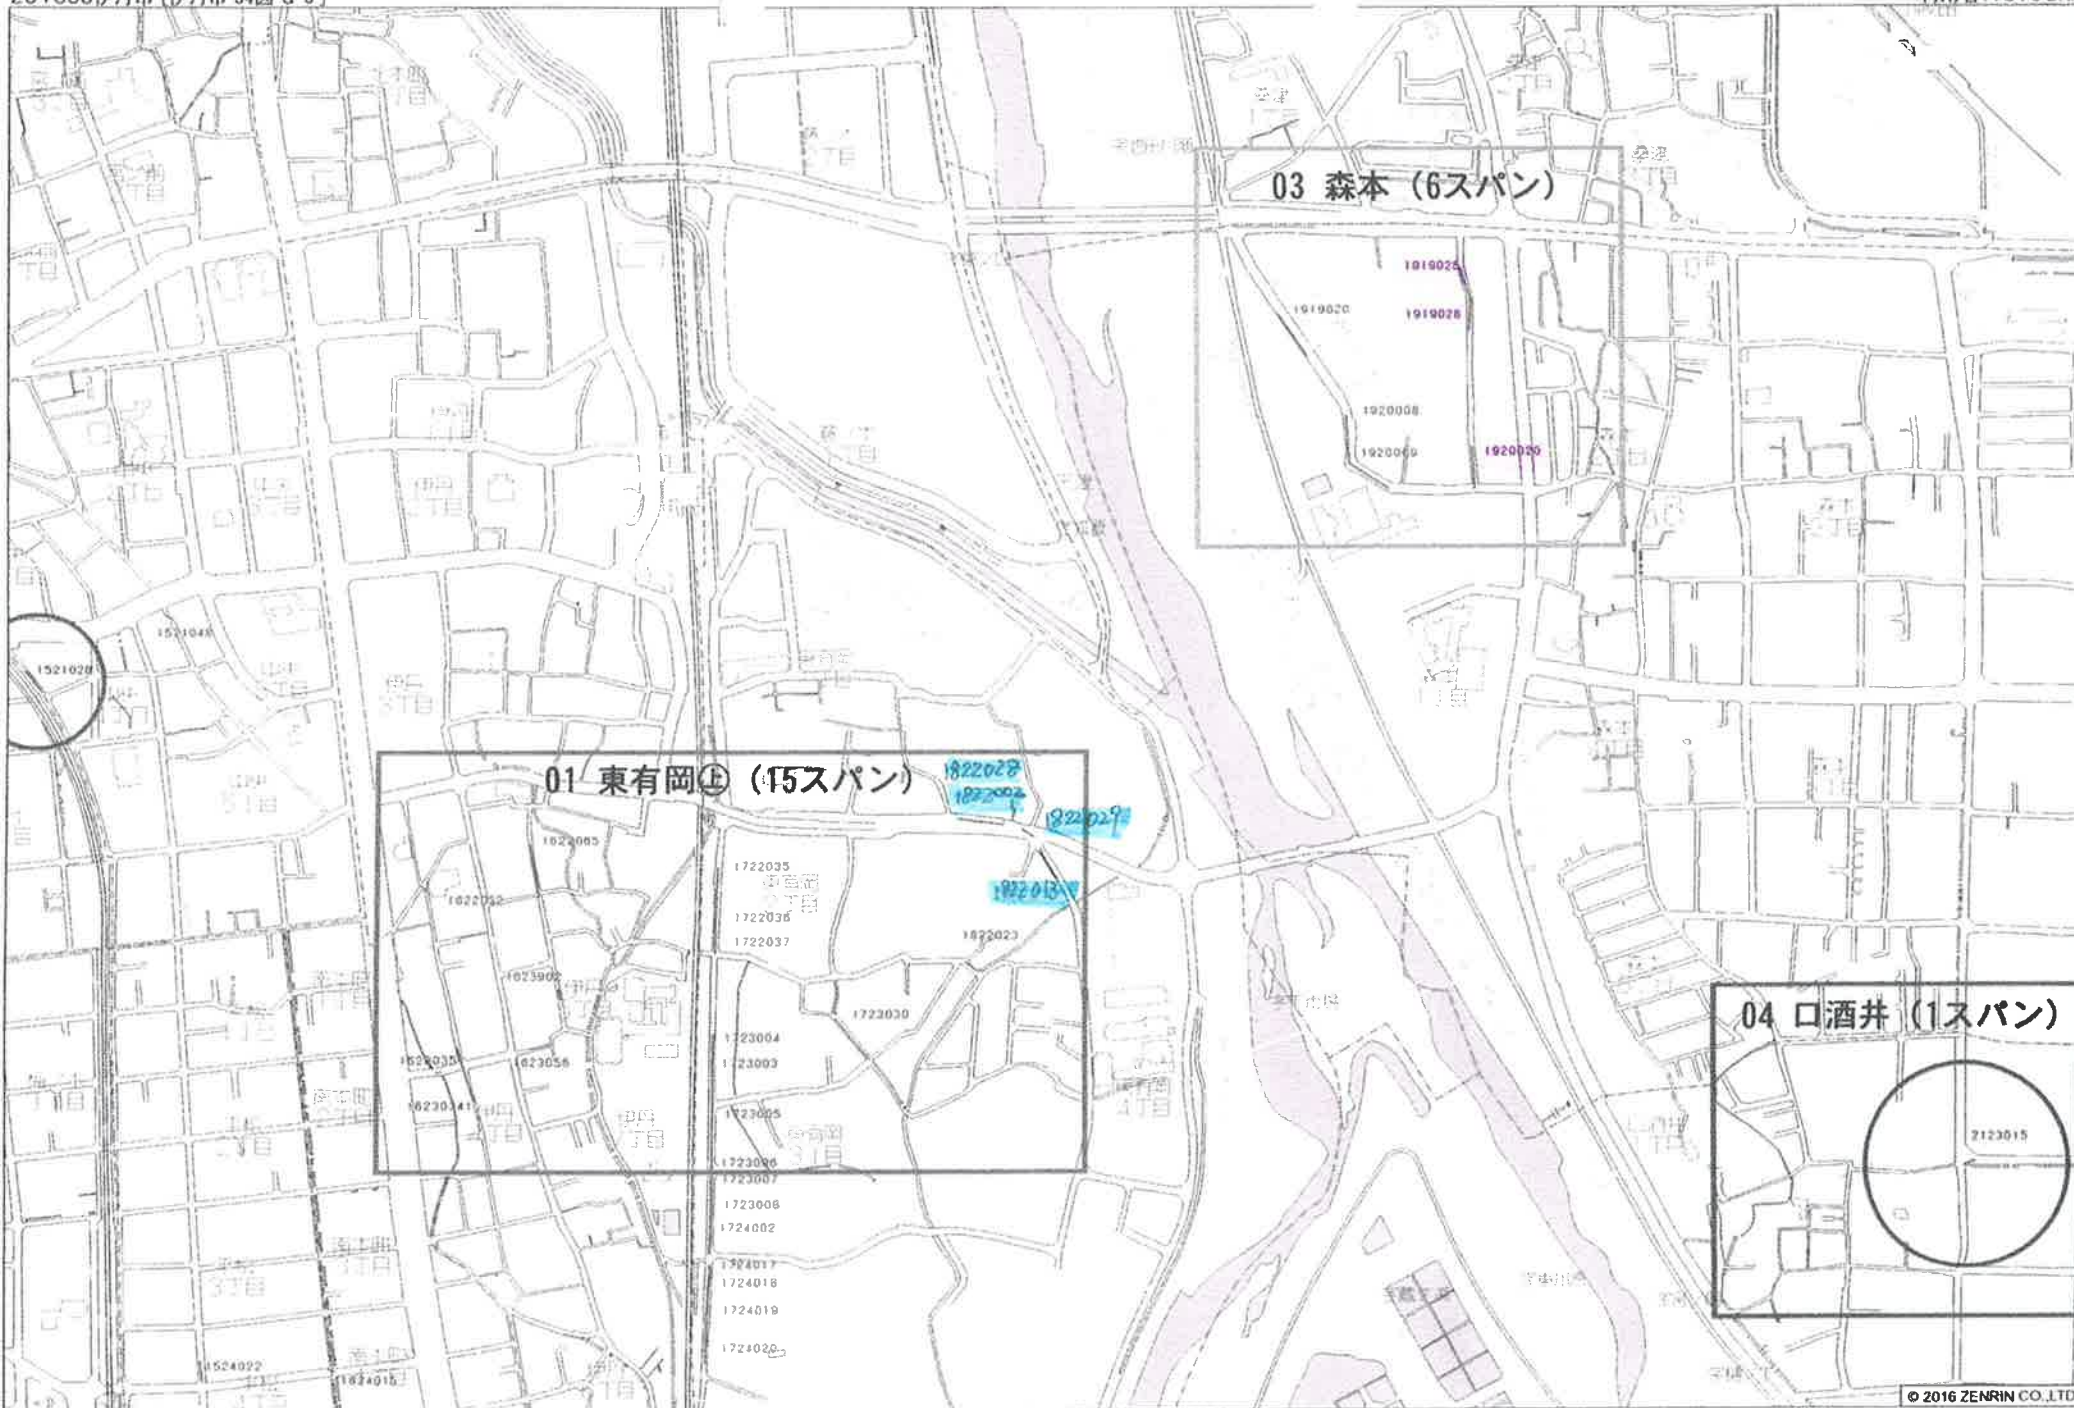

01 東有岡 (15スパン)

03 森本 (6スパン)

04 口酒井 (1スパン)

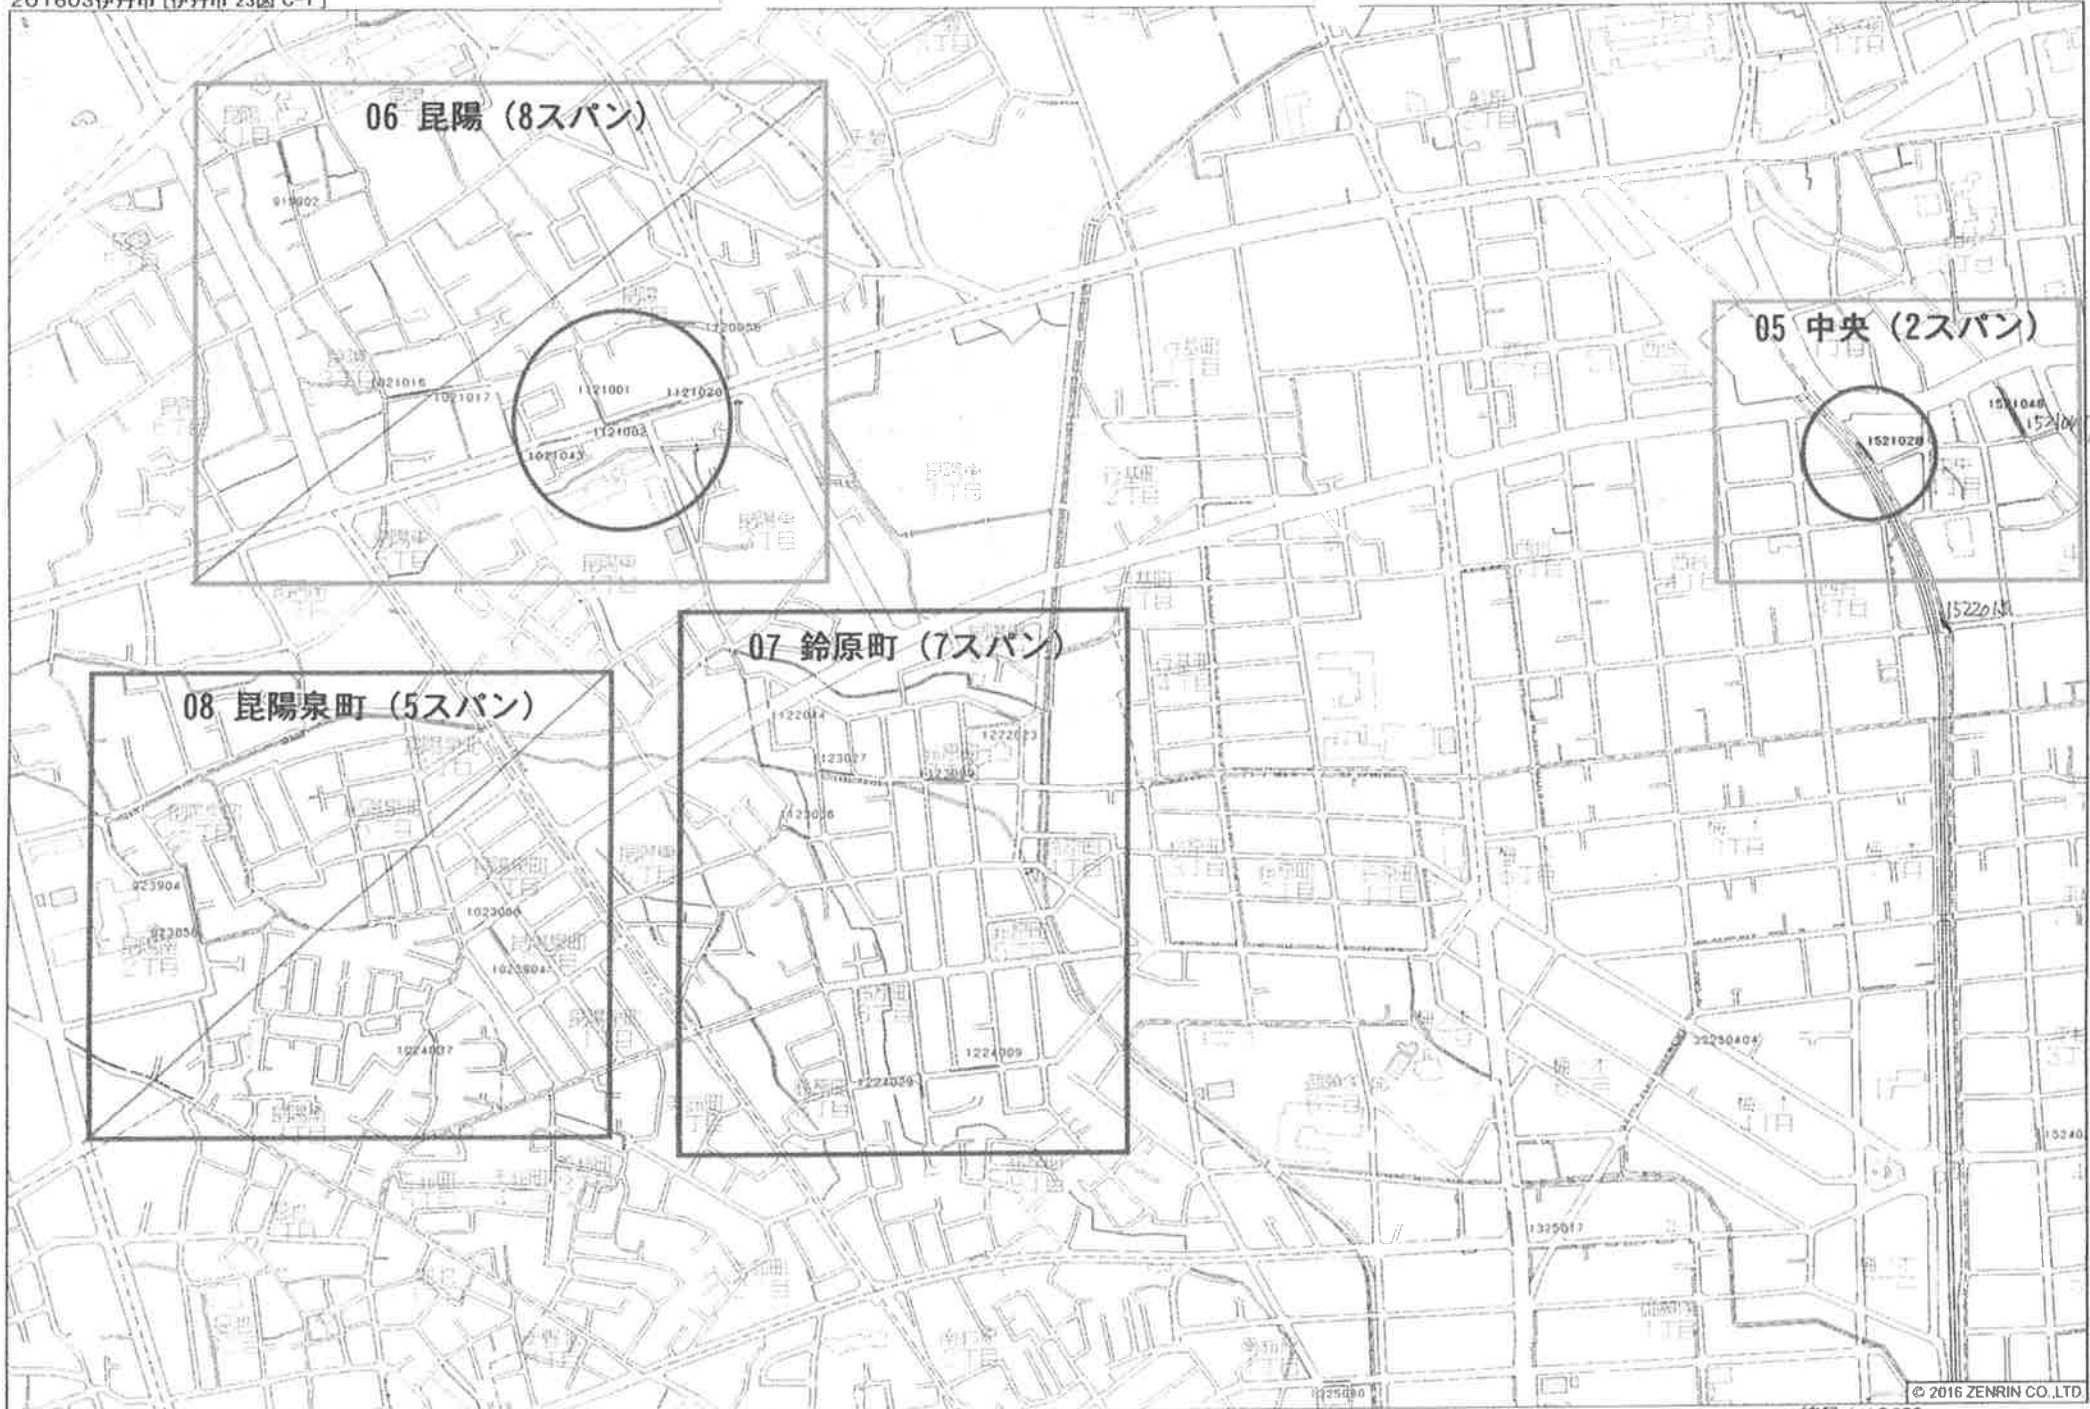

06 昆陽 (8スパン)

05 中央 (2スパン)

08 昆陽泉町 (5スパン)

07 鈴原町 (7スパン)

