

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


工期 自)令和 元年 6月 25日
 至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	9月							9月							
	16日 月	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	23日 日	24日 火	25日 水	26日 木	27日 金	28日 土	29日 日	
前処理		鈴原町 1122044 1123027 1223009 1222023 1123036							東有岡㊦ 1623902 1623056 御願塚㊦ 1428009 南町 1627022 1528036						
本施工			御願塚㊦ 1328064	昆陽 919902	昆陽泉町 1024037					御願塚㊦ 1328063	昆陽 1021016	昆陽泉町 1023904			

凡例 昼間施工 夜間施工

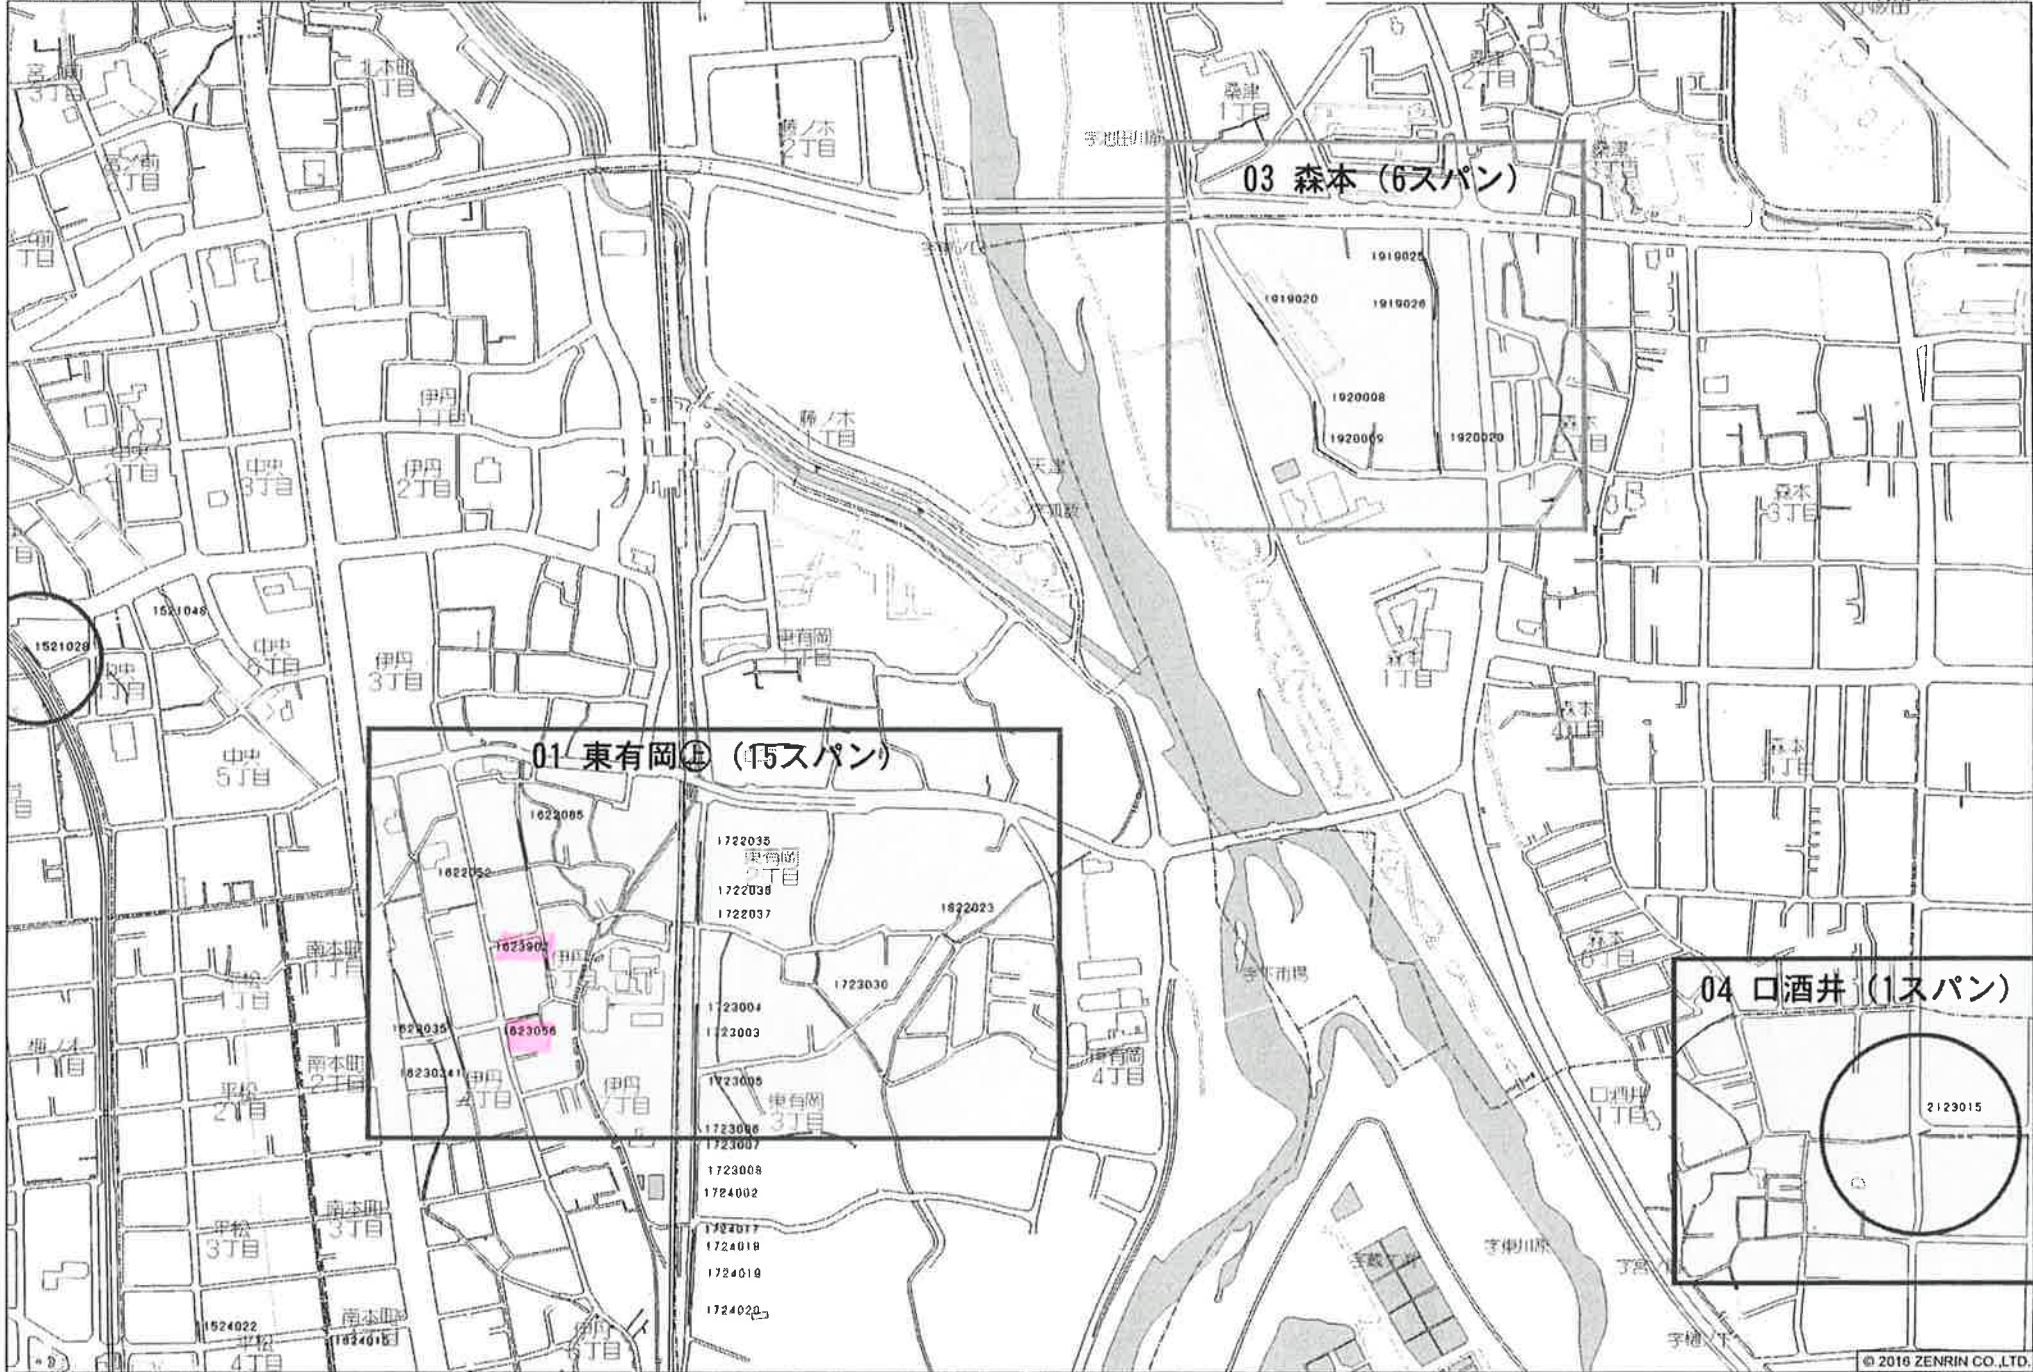

伊丹市東有岡1丁目付近

