

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組


工期 自)令和元年6月25日
至)令和2年3月19日


現場代理人 福島淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	9月							10月							
	30日 月	1日 火	2日 水	3日 木	4日 金	5日 土	6日 日	7日 月	8日 火	9日 水	10日 木	11日 金	12日 土	13日 日	
前処理	東有岡① 1822023 1723030 1622065 1622052 森本 1920020	鈴原町 1223009 御願塚① 1428009 森本 1919025 1919026	昆陽 1021043 1121002 1121020 1121001 中央 1521028	南本町 1724017 1724018 1724019 1724020 1725011	東有岡① 1822029 1822028 1822002										
後処理												昆陽泉町 1024037 1023904			
本施工								東有岡① 16230341	東有岡① 1623056	御願塚① 1327011	昆陽 1021017				
								森本 1920020	鈴原町 1223009	御願塚① 1328062	東有岡① 1723004	東有岡① 1722037			

凡例 昼間施工 夜間施工



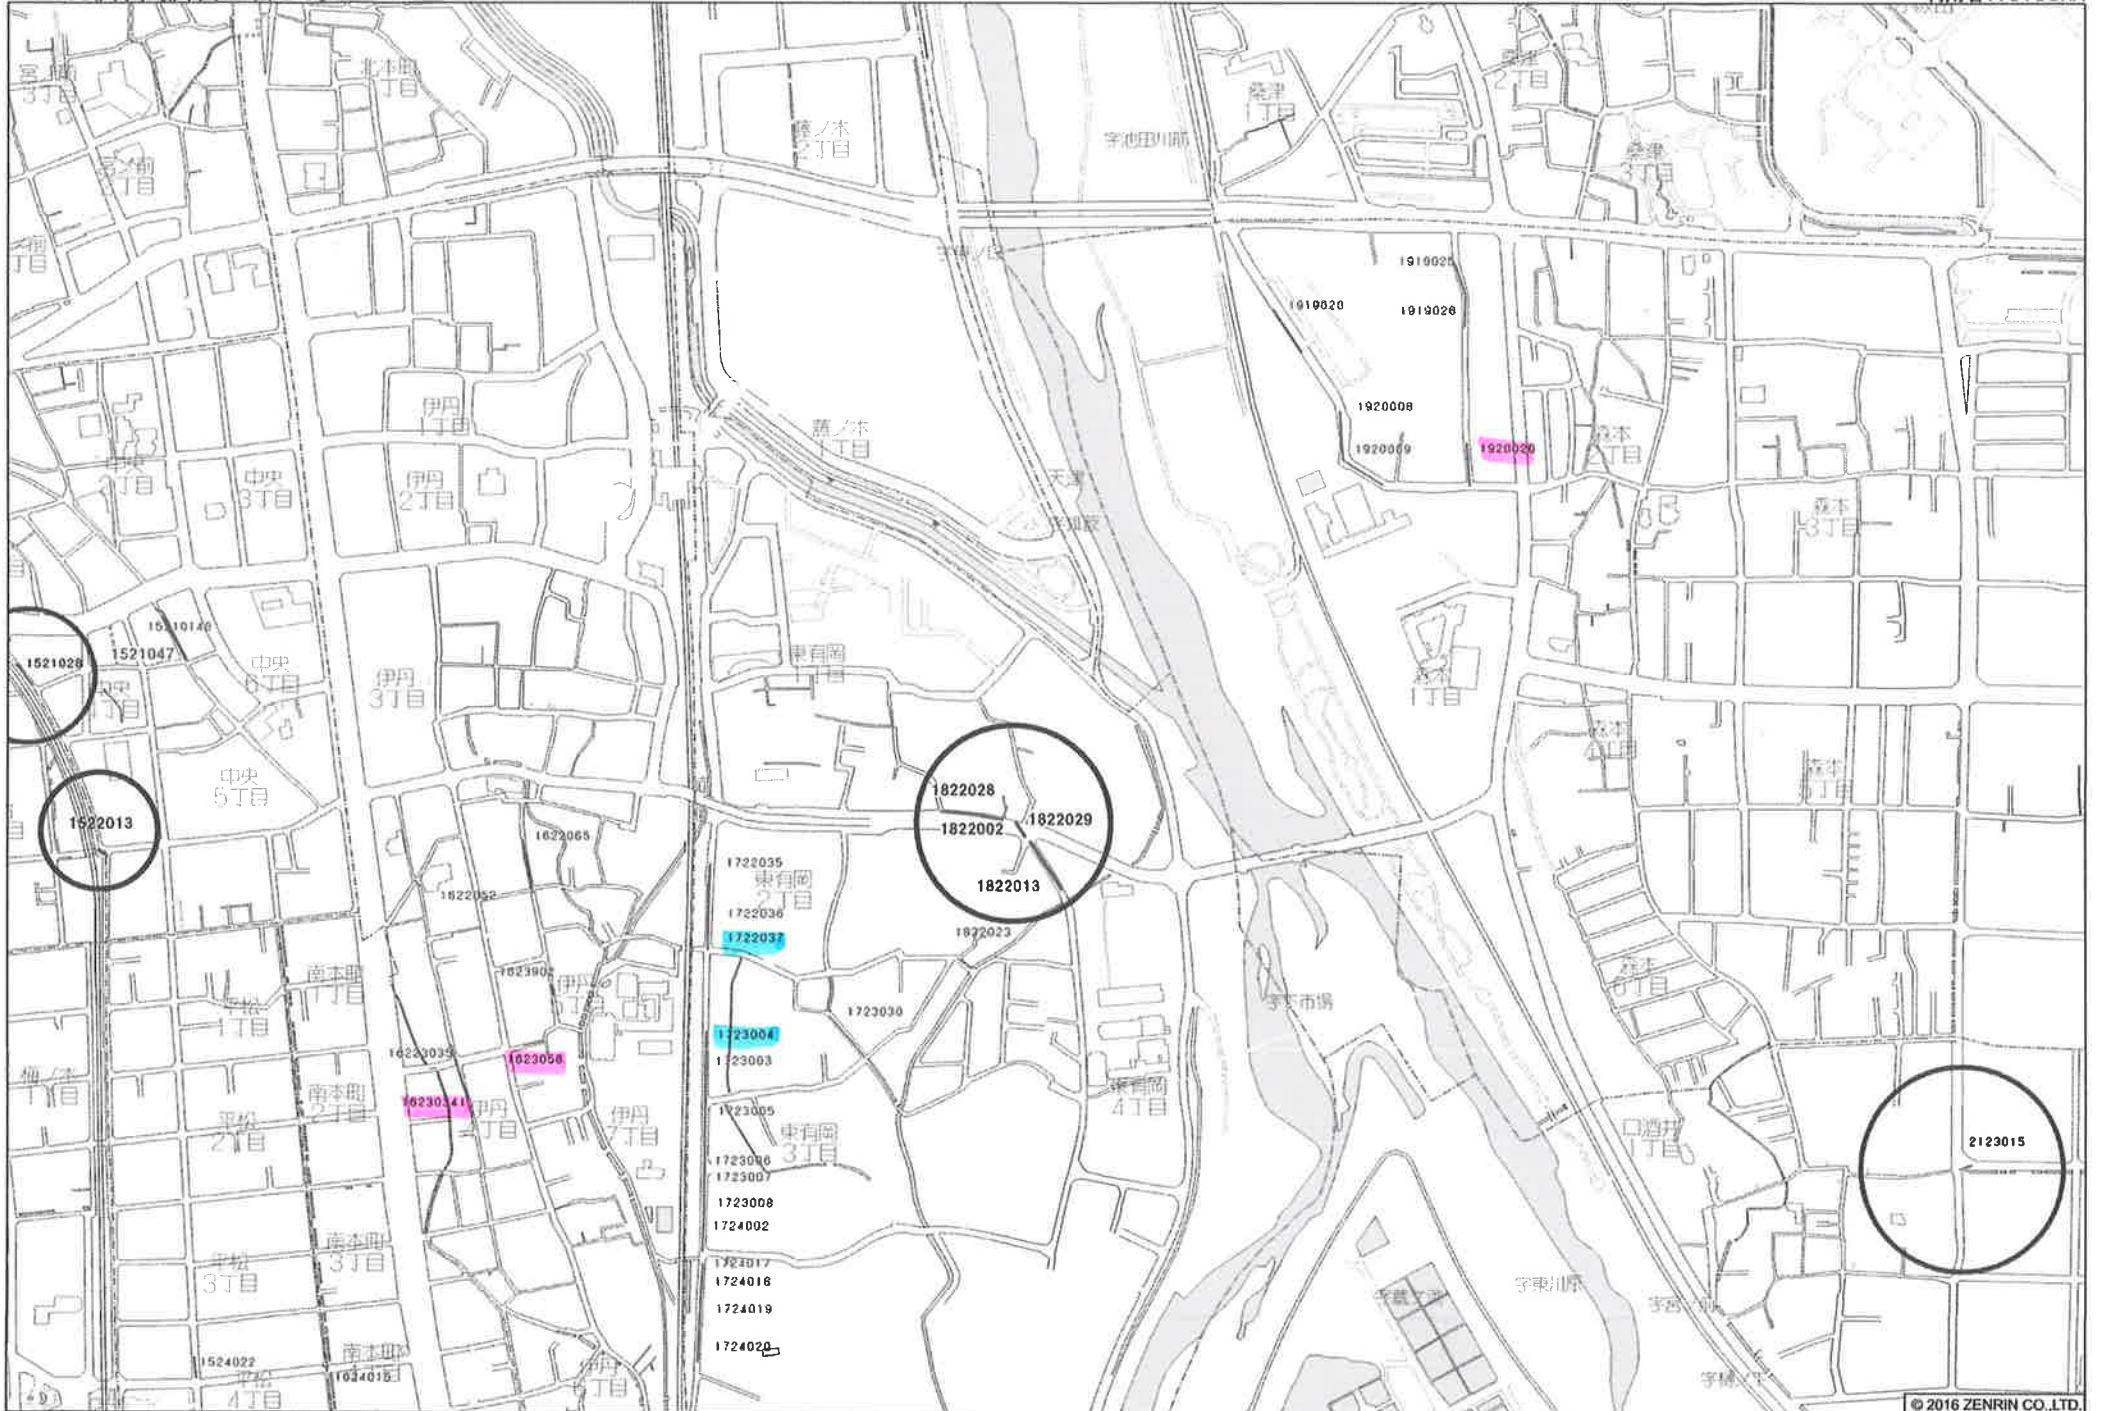

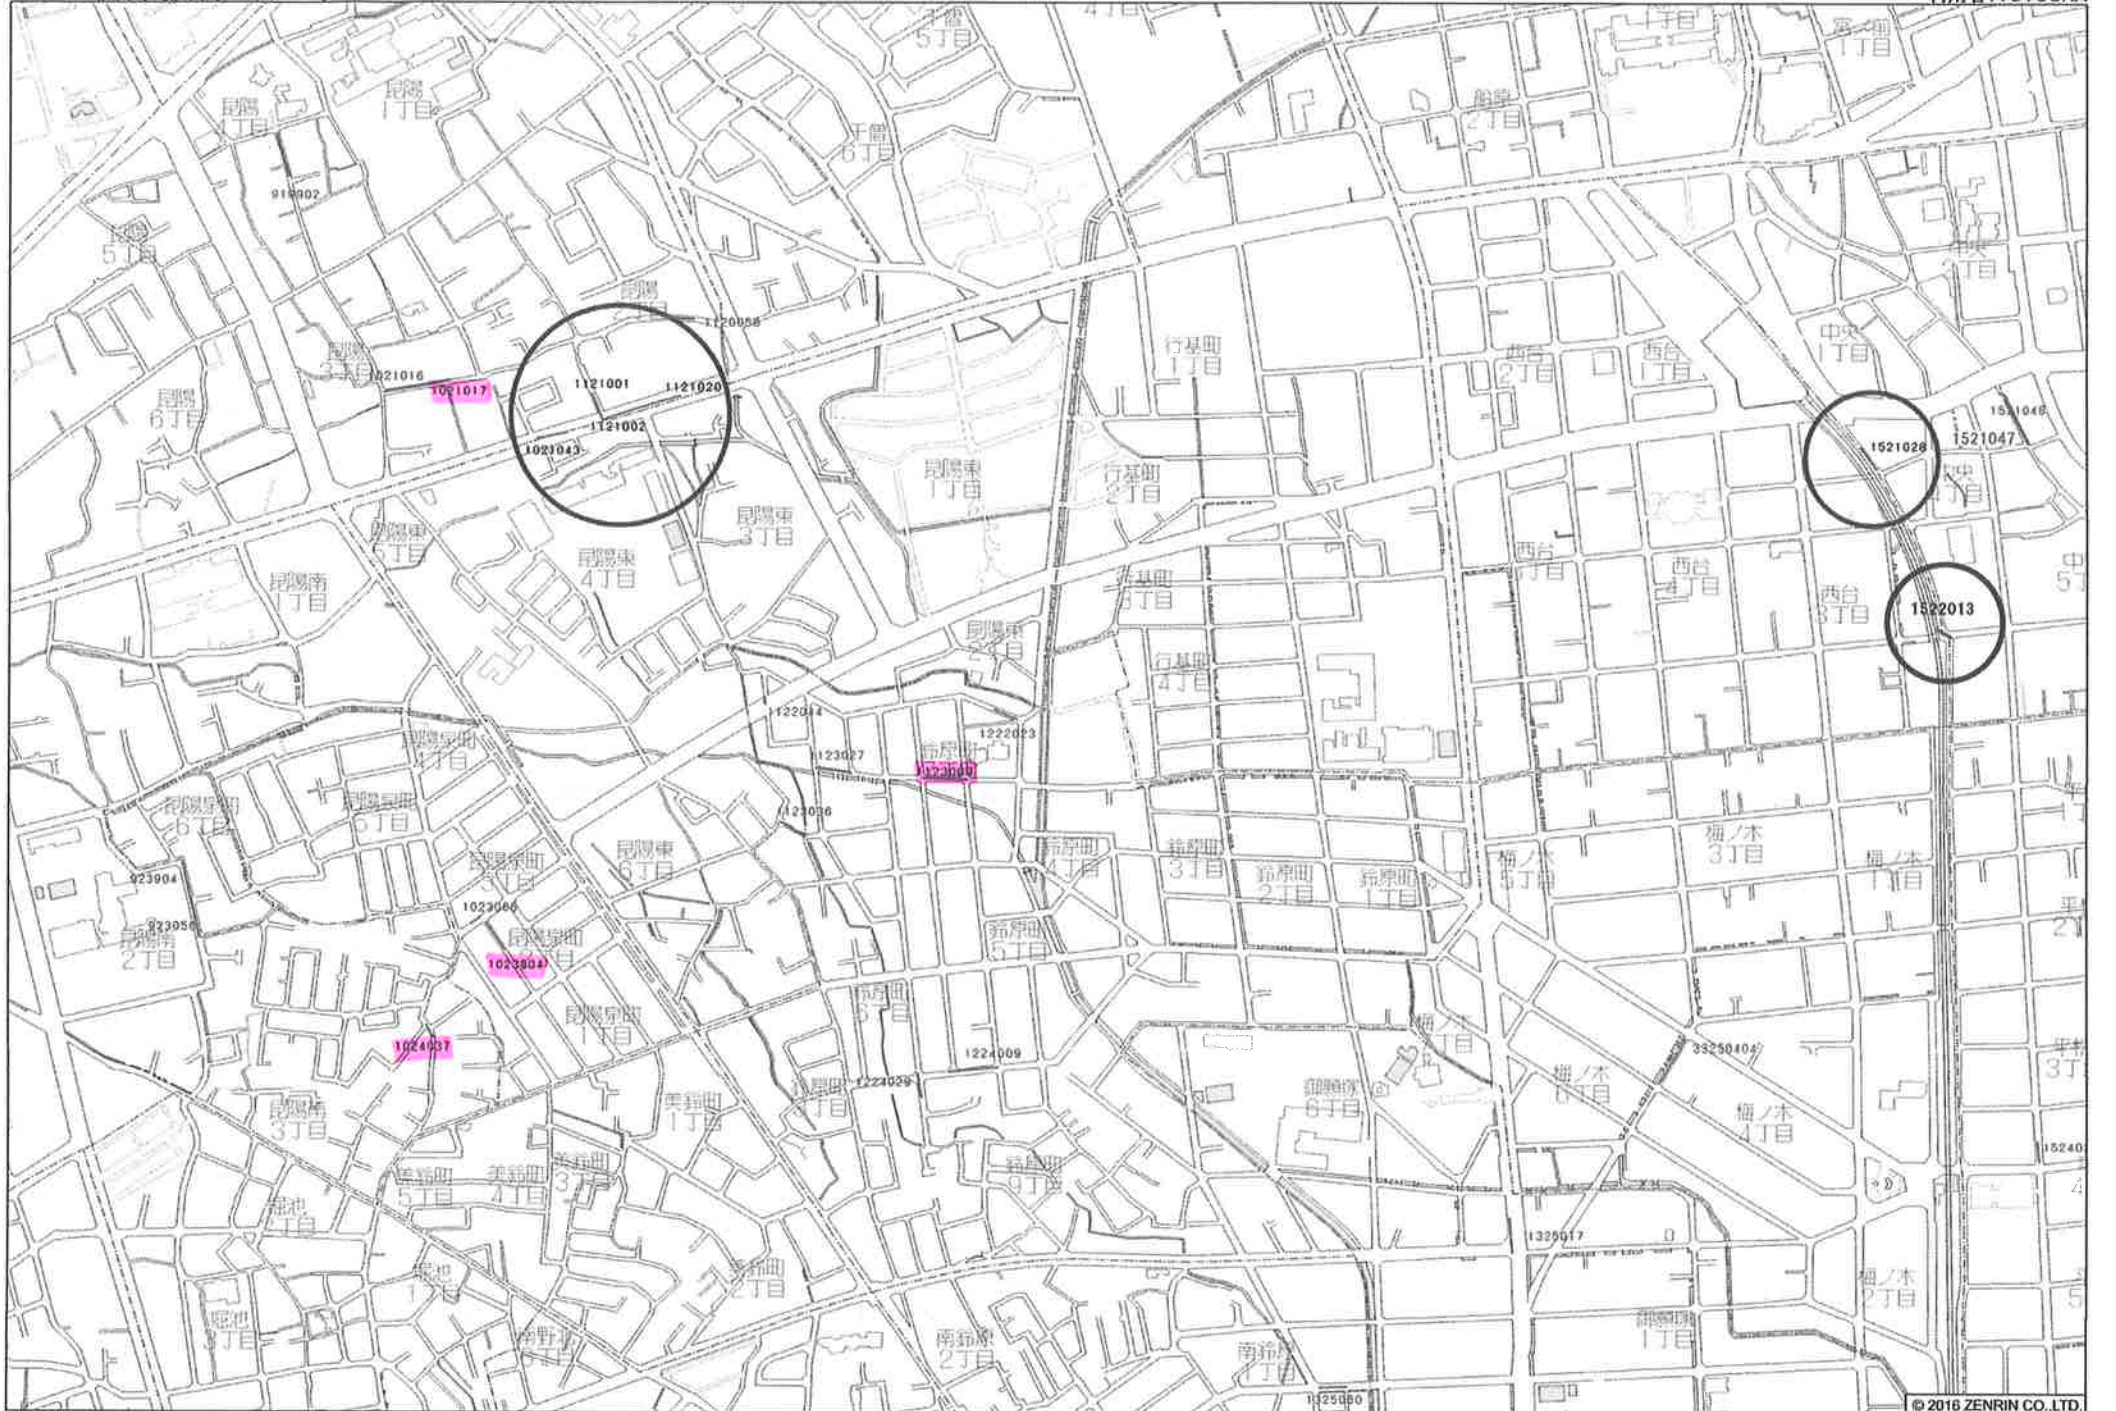

伊丹市鈴原町4丁目付近
