

# 週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和元年6月25日  
 至)令和2年3月19日

現場代理人 福島 淳


施工場所	(実施)							(予定)							備考
	10月														
	14日 月	15日 火	16日 水	17日 木	18日 金	19日 土	20日 日	21日 月	22日 火	23日 水	24日 木	25日 金	26日 土	27日 日	
本施工		豊浦浚渫 東有岡㊤ 1623902	豊浦浚渫 御願塚㊤ 1327012	豊浦浚渫 南町 1628003	豊浦浚渫 昆陽 1021043			豊浦浚渫 東有岡㊤ 1622065		豊浦浚渫 御願塚㊤ 1328047	豊浦浚渫 南本町 1524022	豊浦浚渫 昆陽 1121001			
		大阪環境 昆陽 1123027	大阪環境 森本 1920009	大阪環境 東有岡㊤ 1722036	大阪環境 東有岡㊤ 1722035			大阪環境 昆陽泉 923904		大阪環境 森本 1920008	大阪環境 東有岡㊤ 1723005	大阪環境 東有岡㊤ 1723006			

凡例 昼間施工  夜間施工

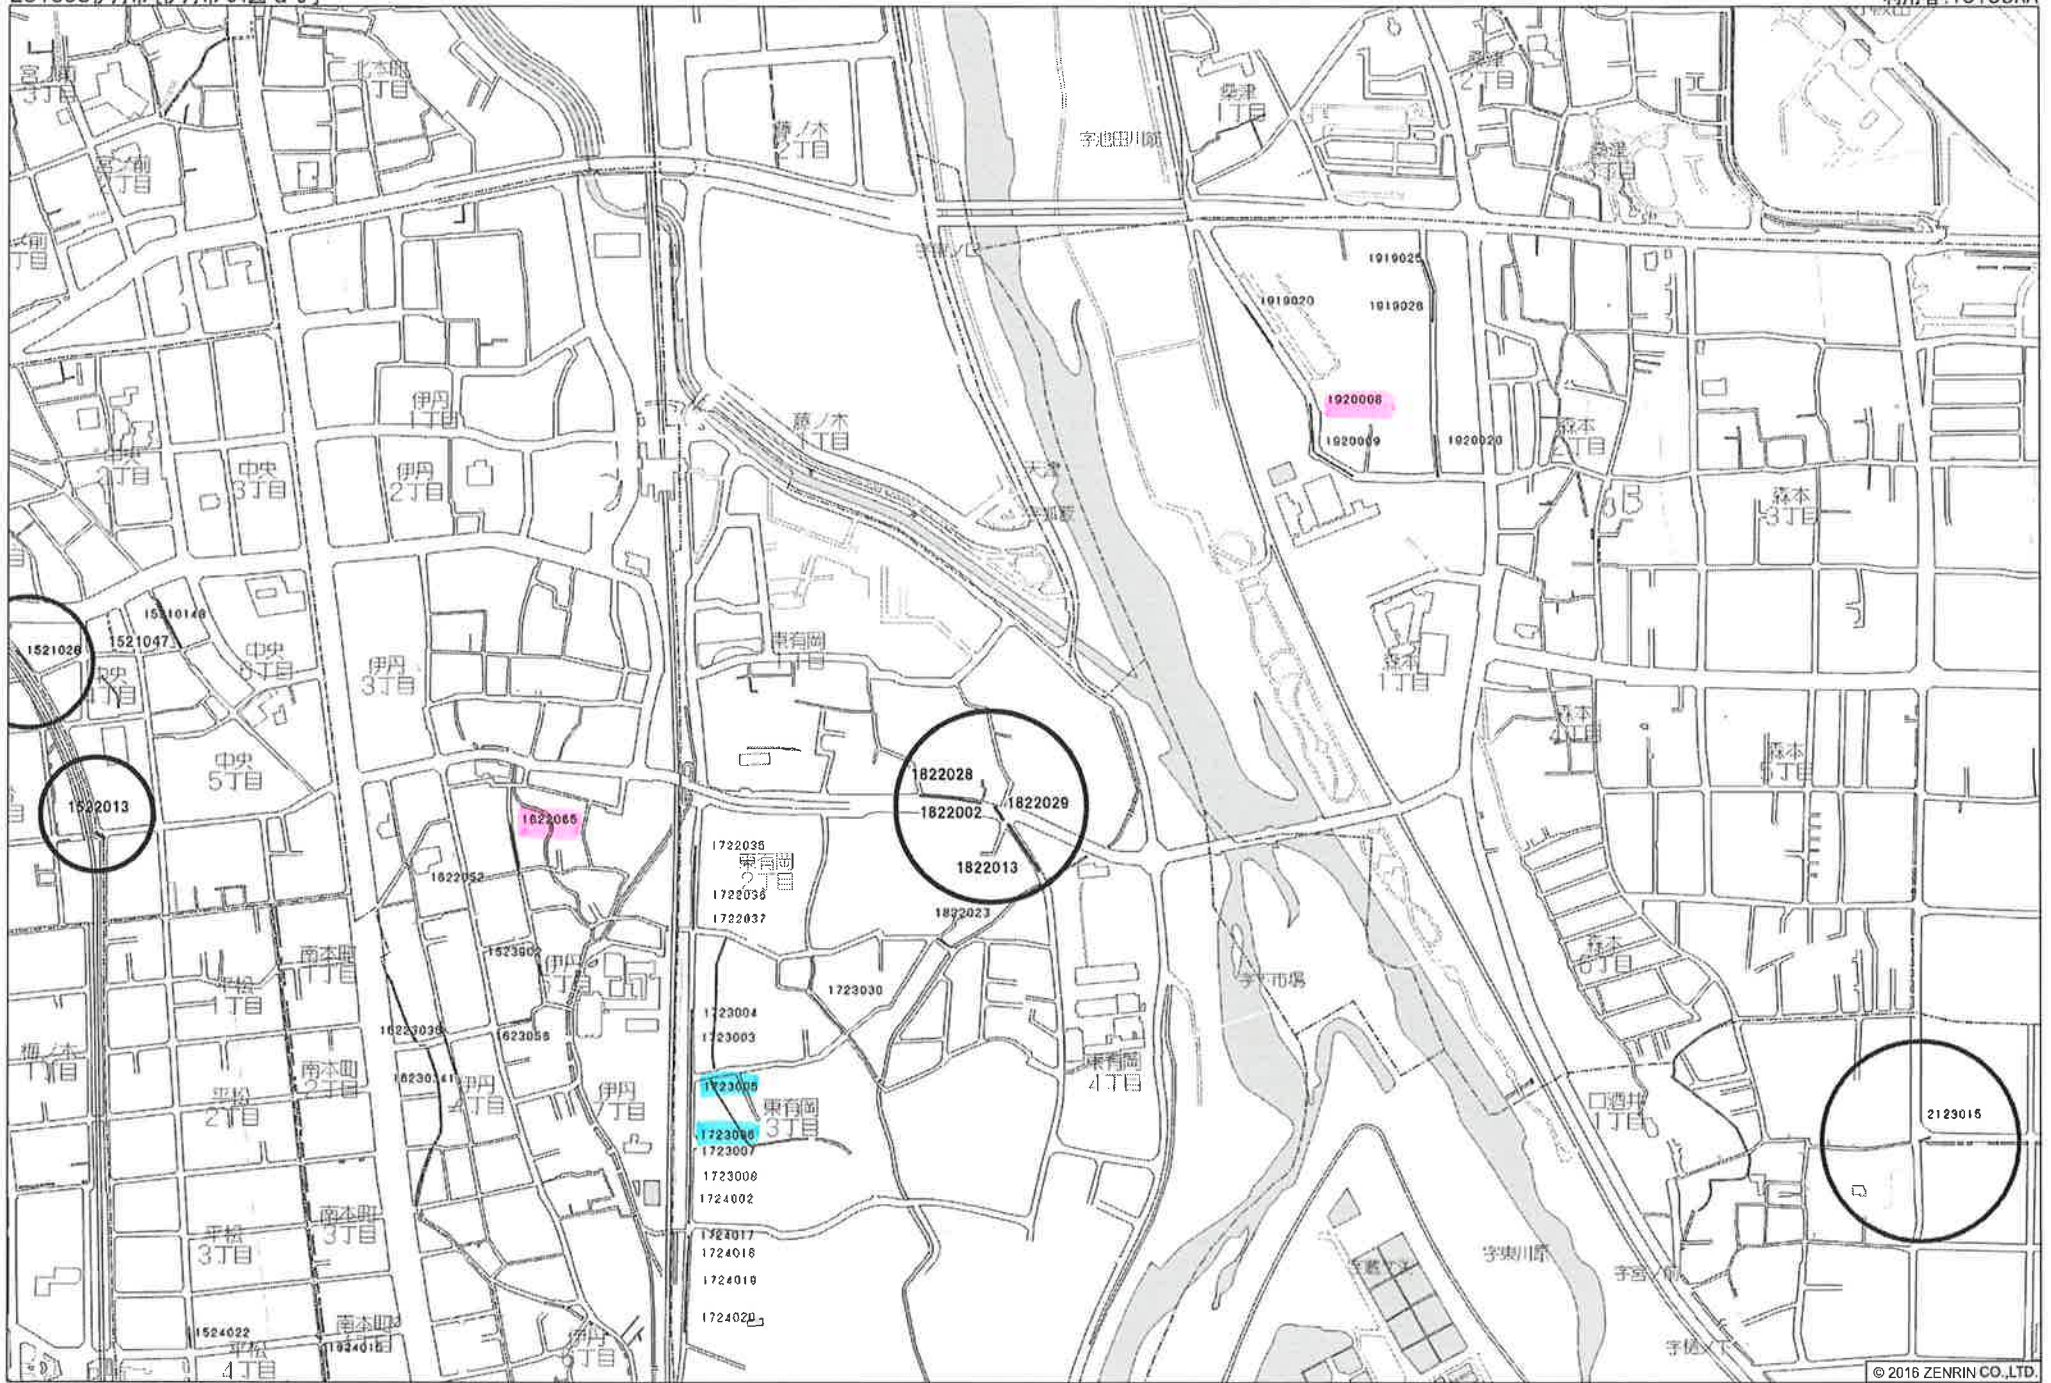

伊丹市東有岡1丁目付近



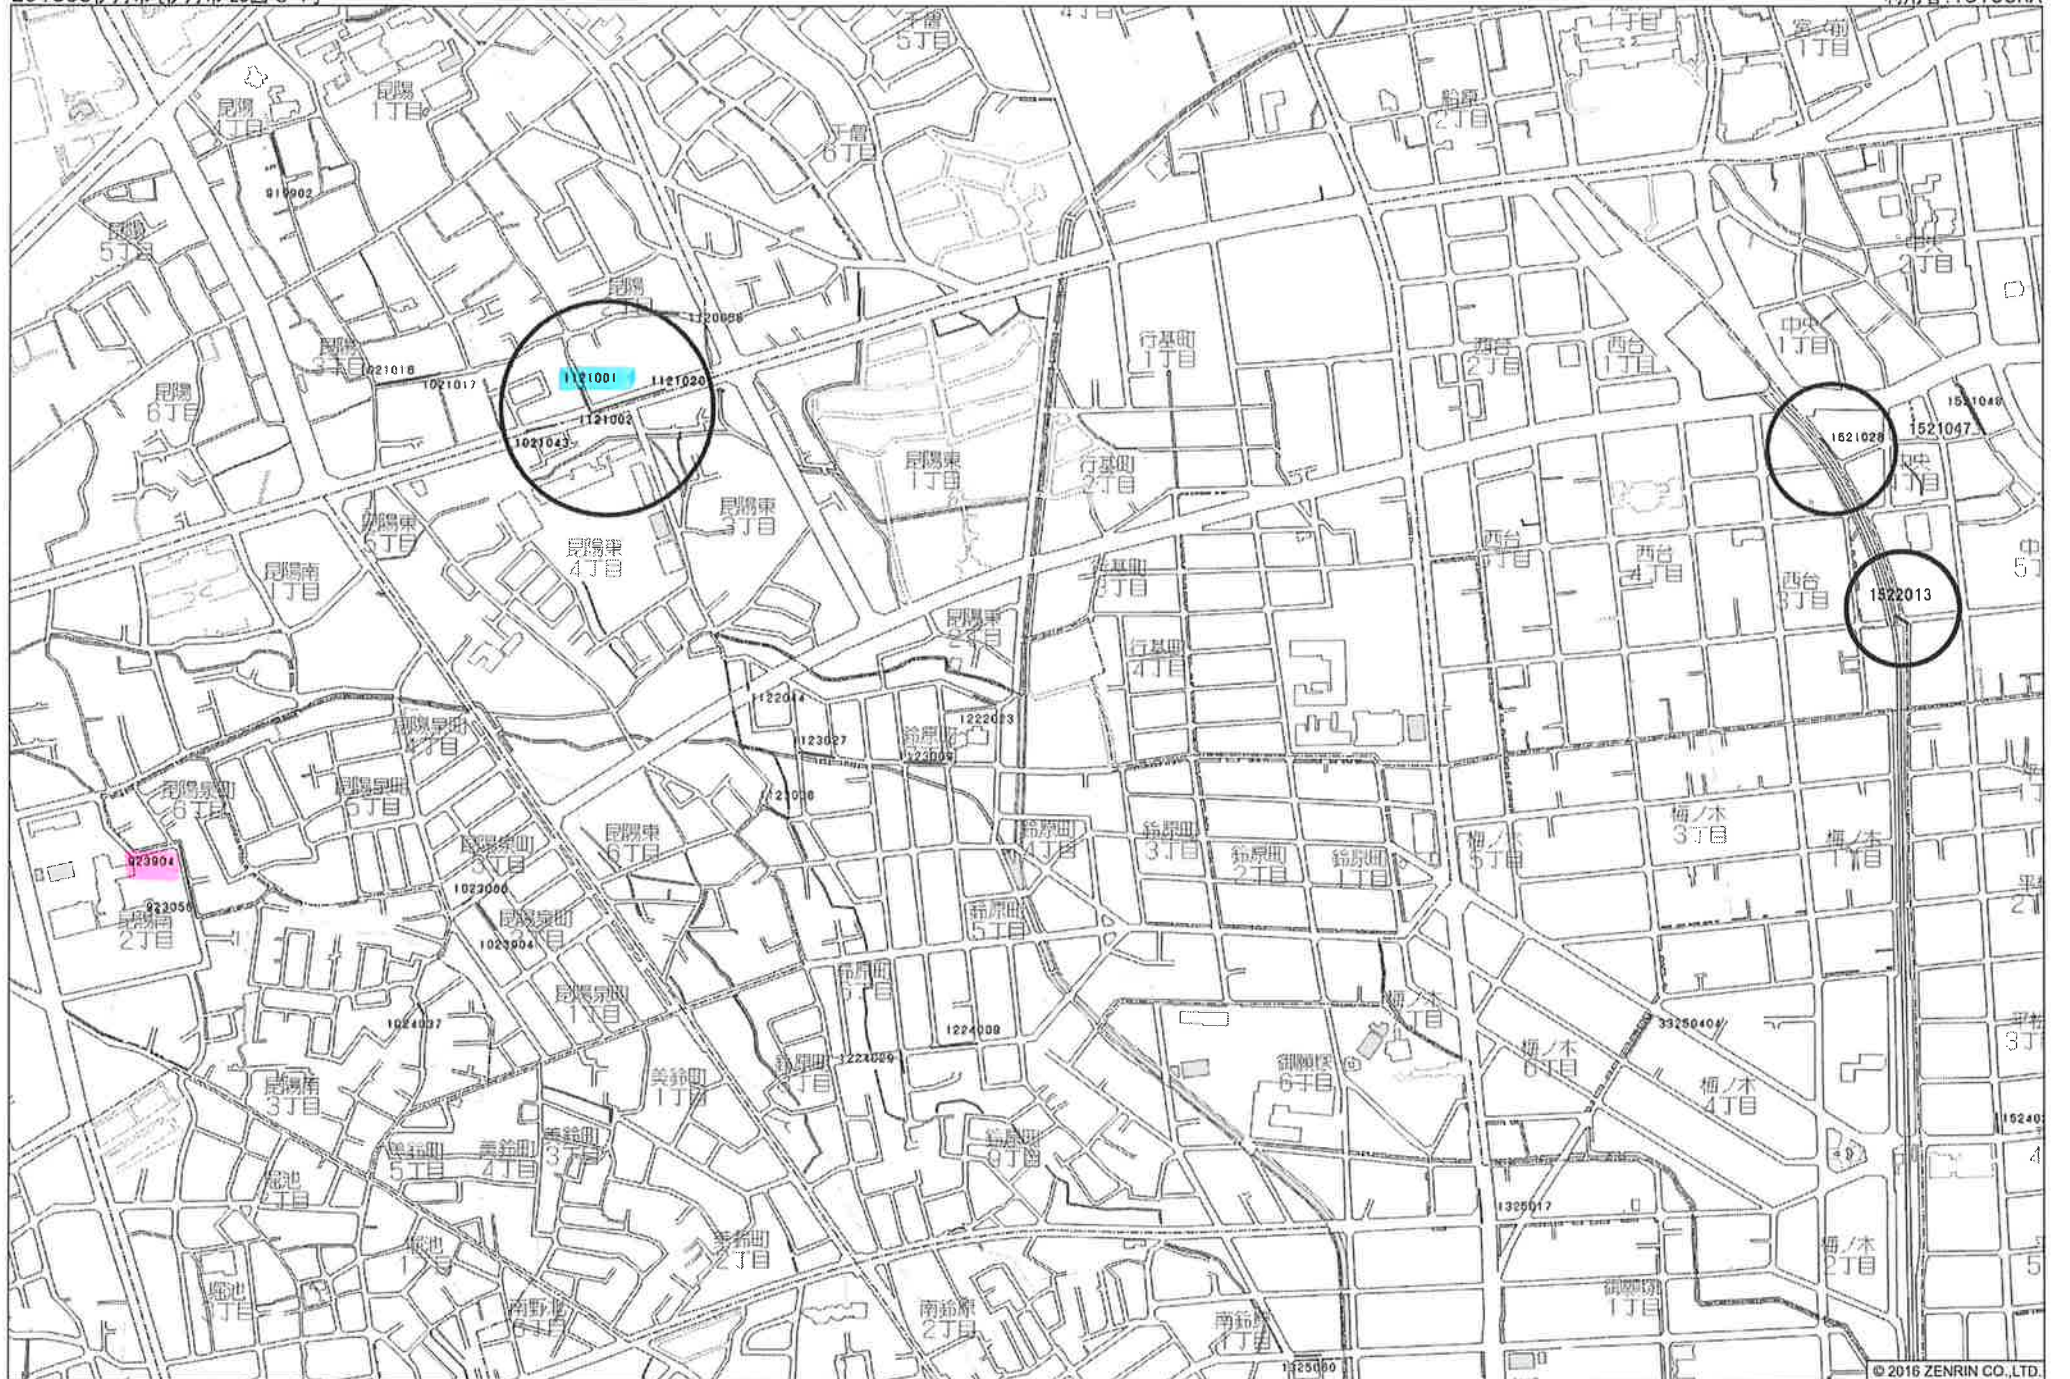

伊丹市鈴原町4丁目付近
