

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和元年 6月 25日
 至)令和2年 3月 19日


現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)					(予定)										備考
	10月					11月										
	28日 月	29日 火	30日 水	31日 木	1日 金	2日 土	3日 日	4日 月	5日 火	6日 水	7日 木	8日 金	9日 土	10日 日		
本施工																
	昆陽泉 923056	鈴原 1223009	森本 1919020	南本町 1624015	南本町 1724019					鈴原 1224009	御願塚 1328048	昆陽 1120056	南本町 1723007			

凡例 昼間施工 夜間施工



伊丹市御願塚2丁目付近

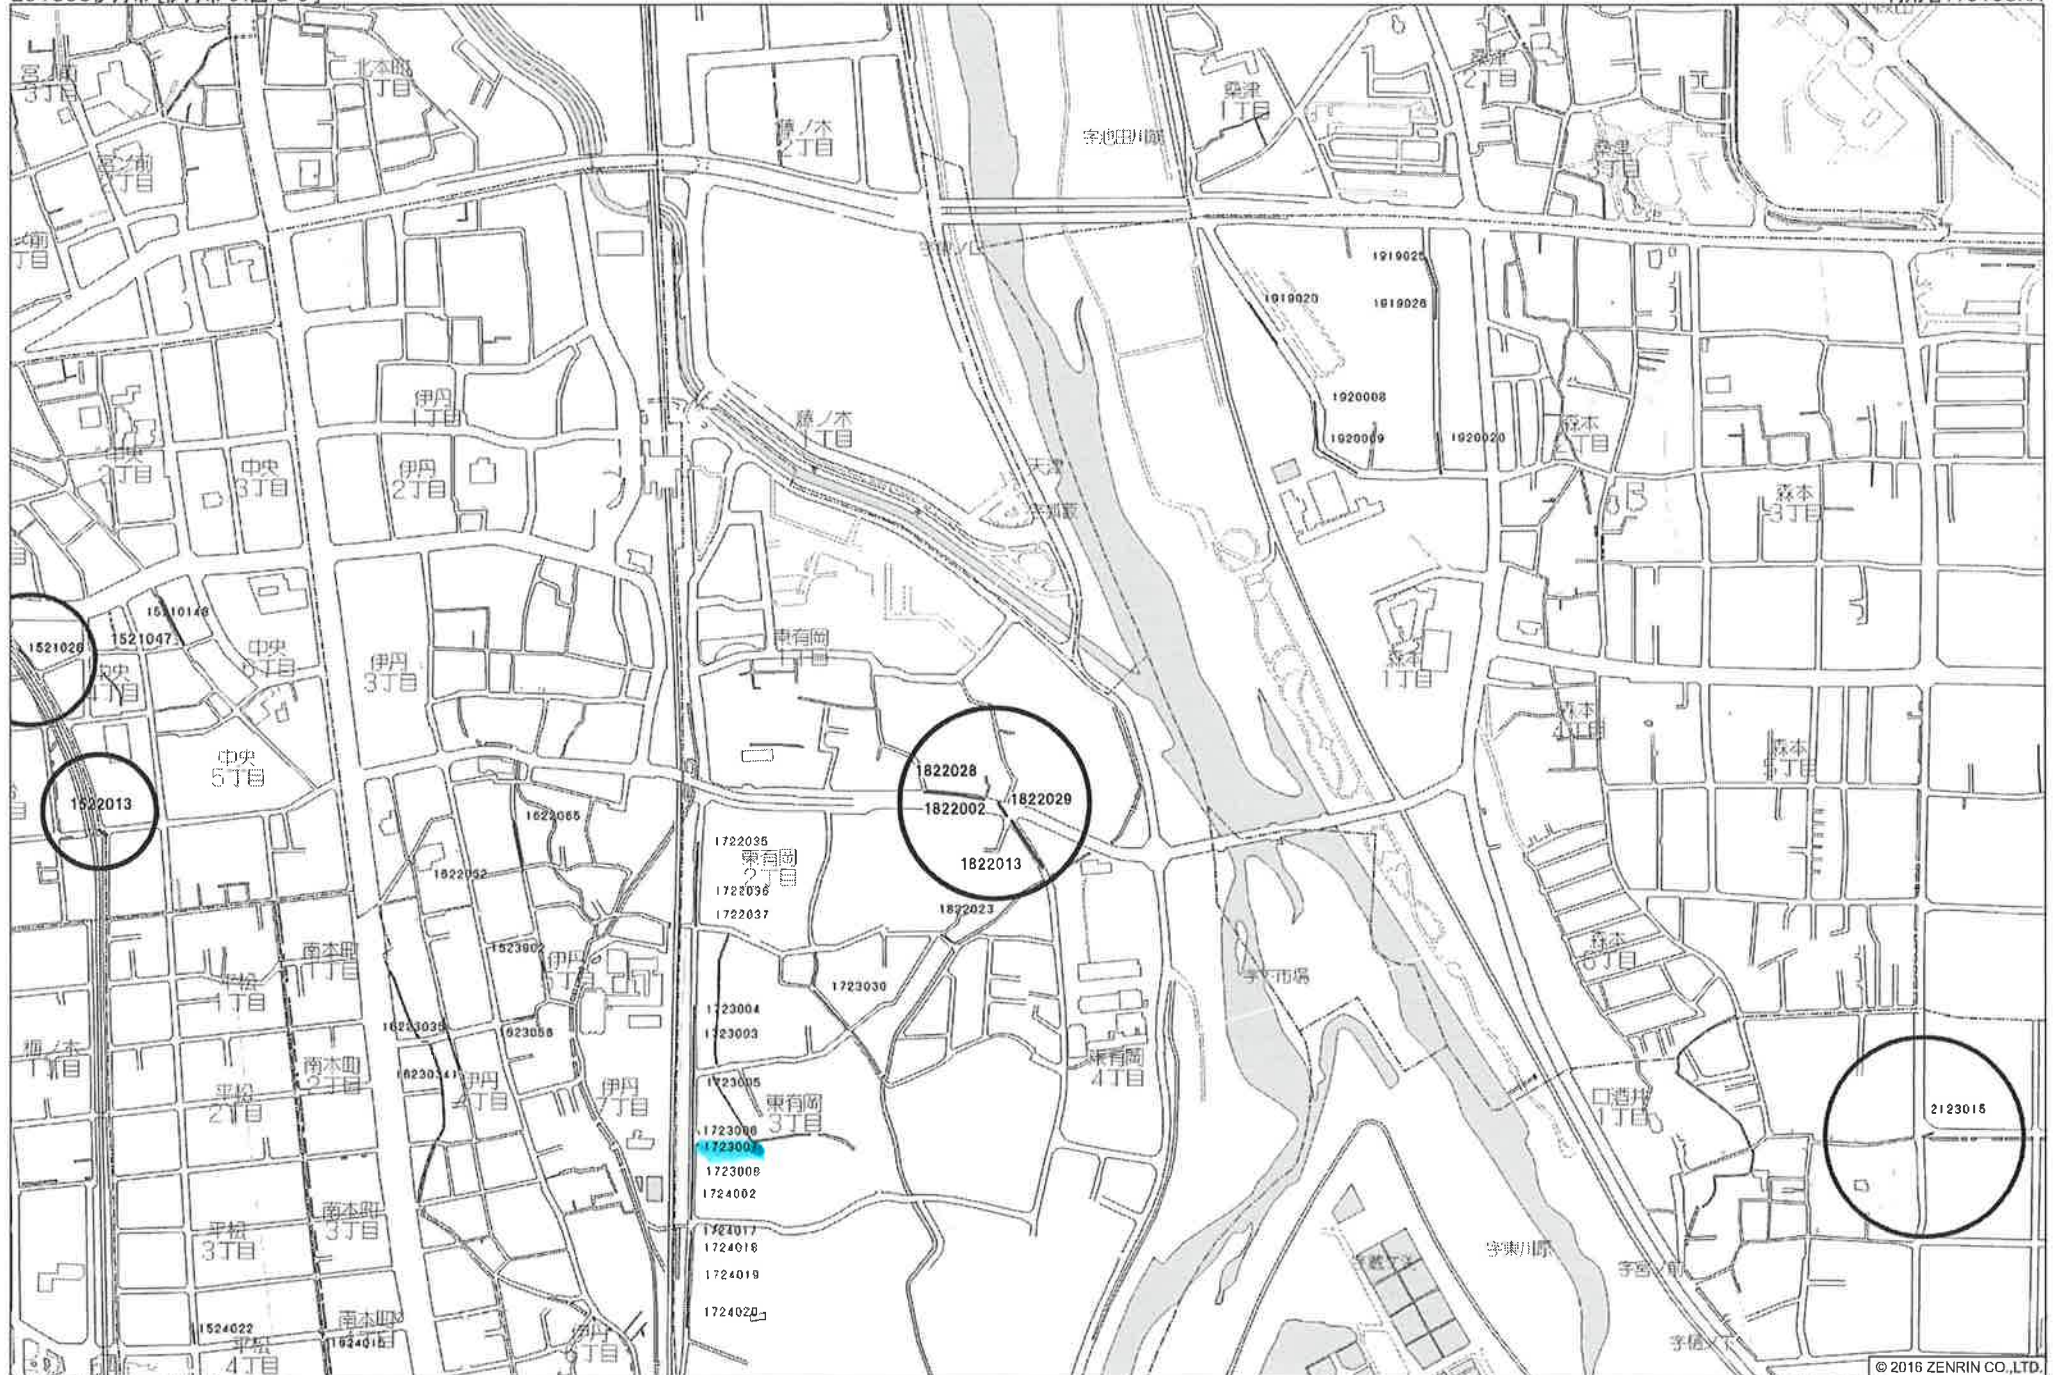

伊丹市東有岡1丁目付近
