

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	11月														
	4日 月	5日 火	6日 水	7日 木	8日 金	9日 土	10日 日	11日 月	12日 火	13日 水	14日 木	15日 金	16日 土	17日 日	
本施工		■ 鈴原 1224009	■ 御願塚 1328048	■ 昆陽 1120056	■ 南本町 1723007			■ 東有岡 1623035	■ 鈴原 1122044				■ 南本町 1725011		
後処理										■	■				

凡例 昼間施工 ■ 夜間施工 ■

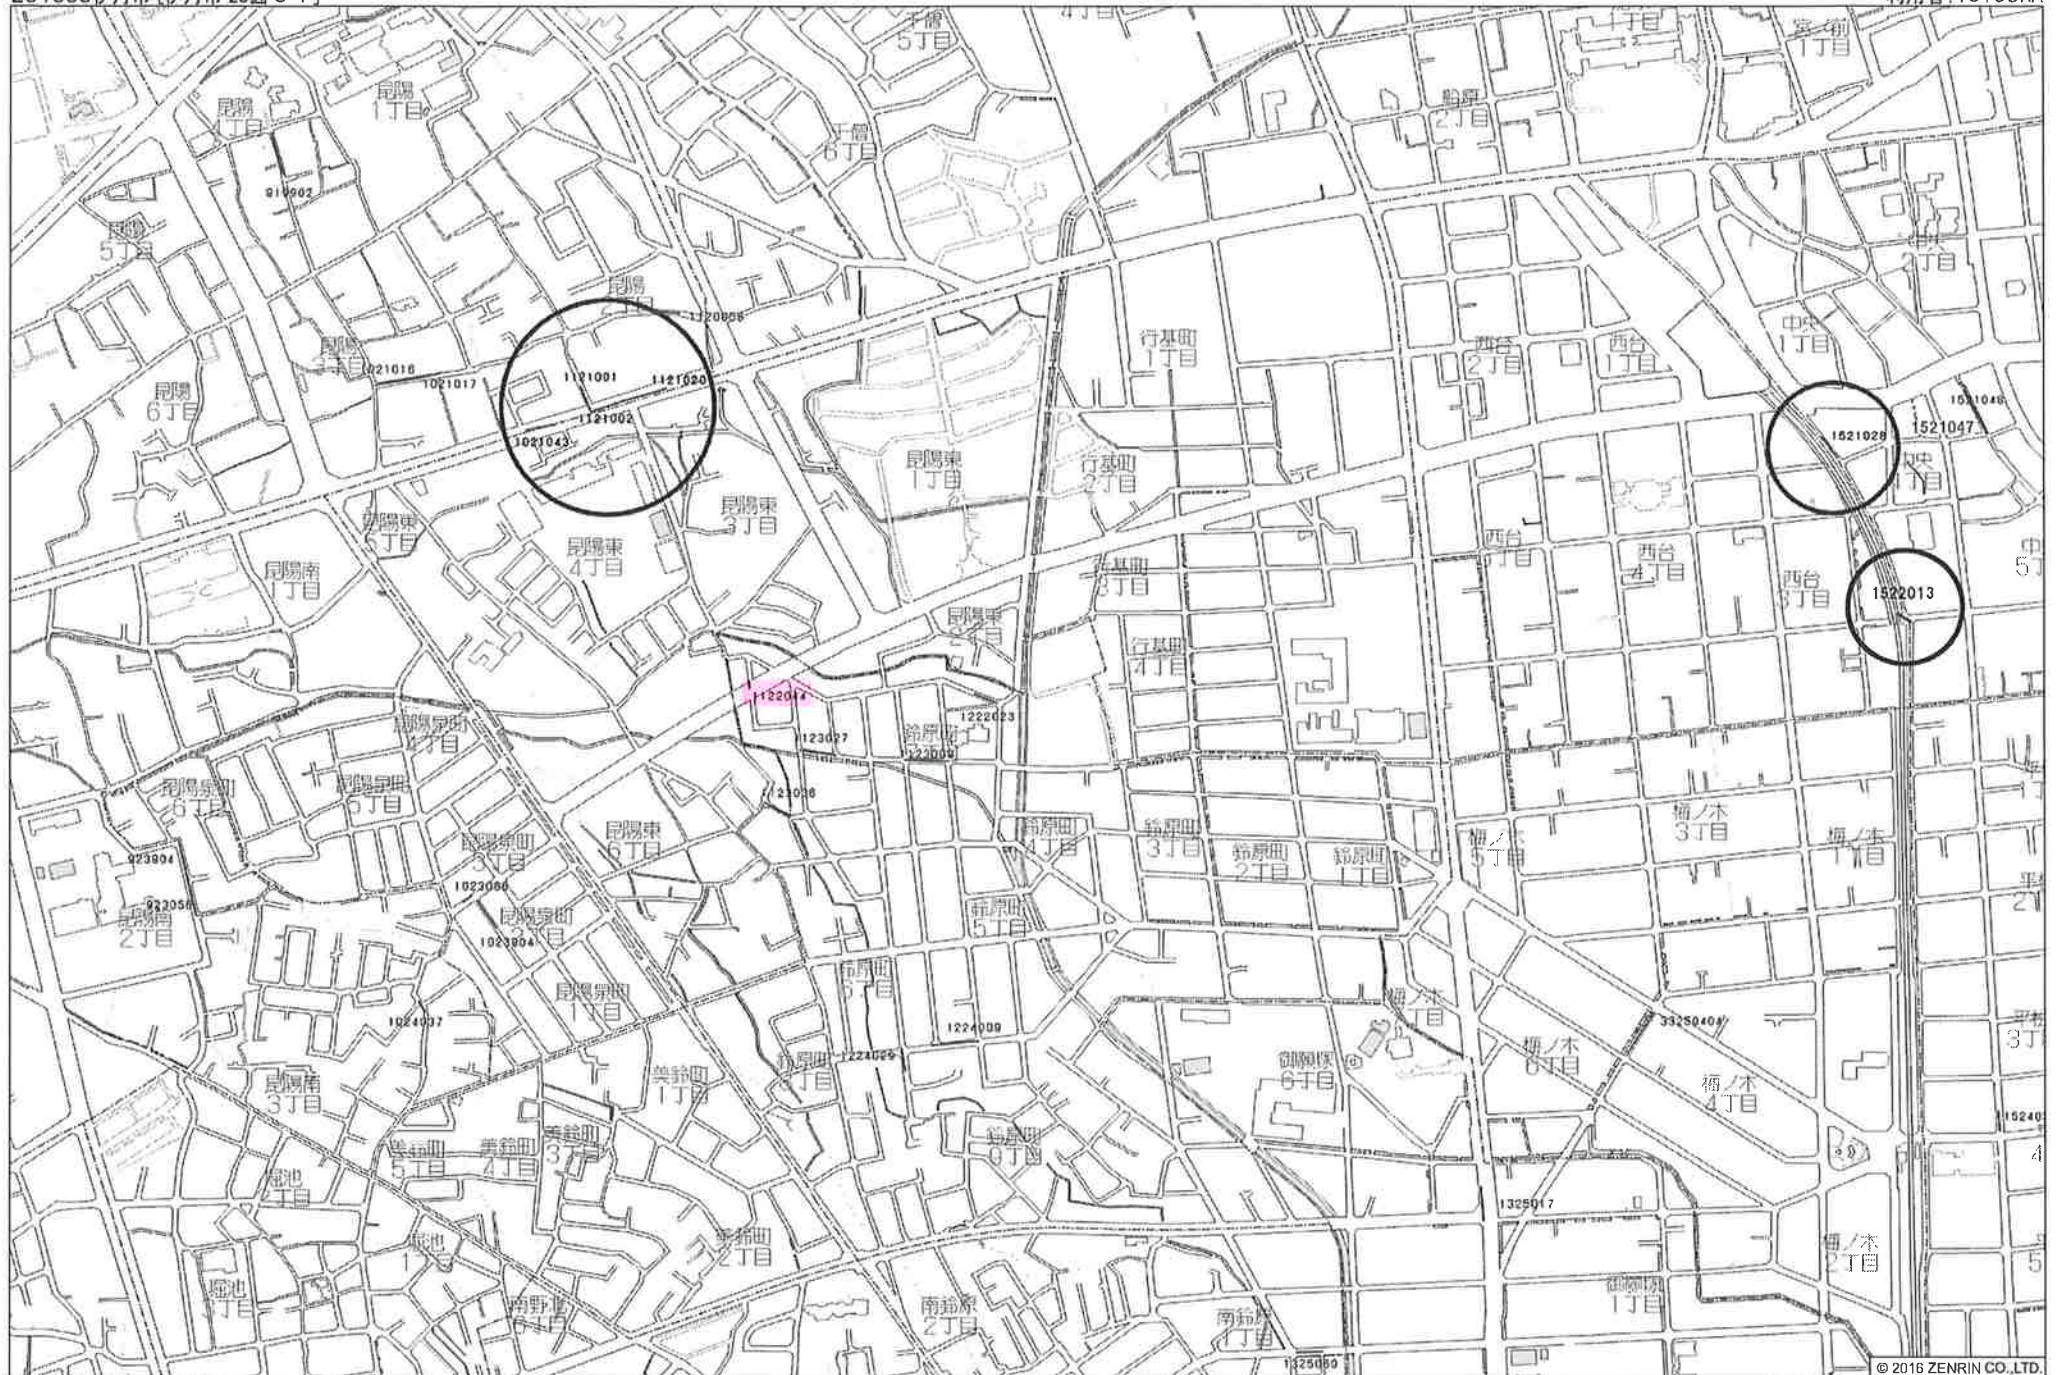



伊丹市御願塚2丁目付近
