

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	11月														
	11日 月	12日 火	13日 水	14日 木	15日 金	16日 土	17日 日	18日 月	19日 火	20日 水	21日 木	22日 金	23日 土	24日 日	
本施工	東有岡 1623035	鈴原 1122044			南本町 1725011			昆陽泉 1023066	御願塚 1325017			南本町 1723008			
後処理															

凡例 昼間施工  夜間施工 

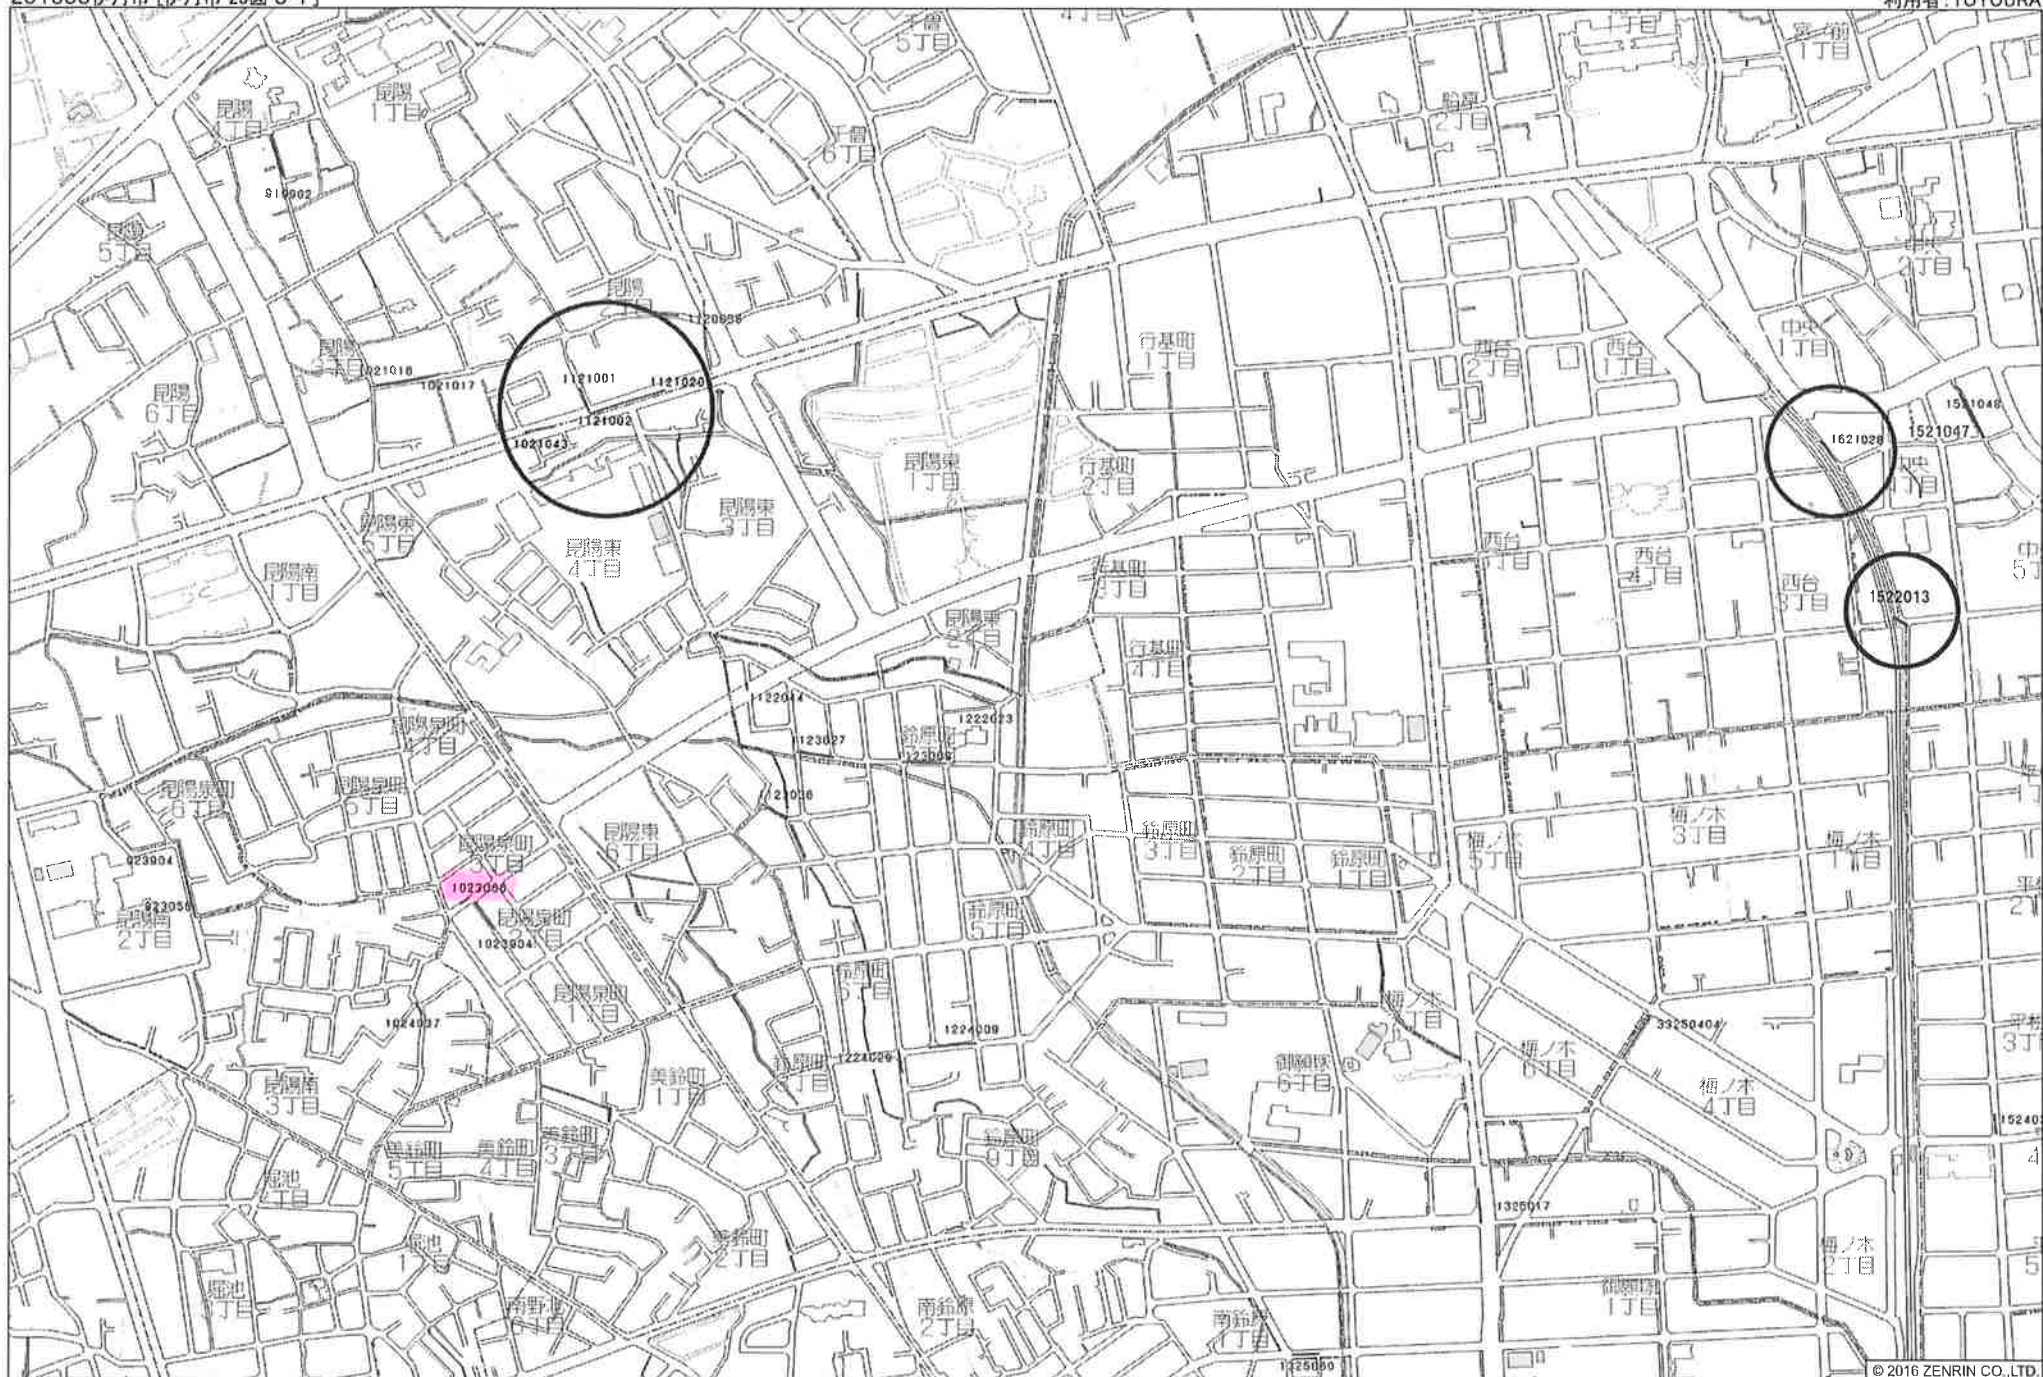

伊丹市鈴原町4丁目付近

