

週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日


現場代理人 福島 淳

	(実施)							(予定)							備考
	12月														
	9日 月	10日 火	11日 水	12日 木	13日 金	14日 土	15日 日	16日 月	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	
本施工	森本 1919025	鈴原 1123036	昆陽 1121020	南本町 1724002	南本町 1724018			東有岡 1723030	南町 1528036	中央 1521028	東有岡 1822029	昆陽 1121002			
						試験堀									
						中央 1522013									


凡例 昼間施工 夜間施工

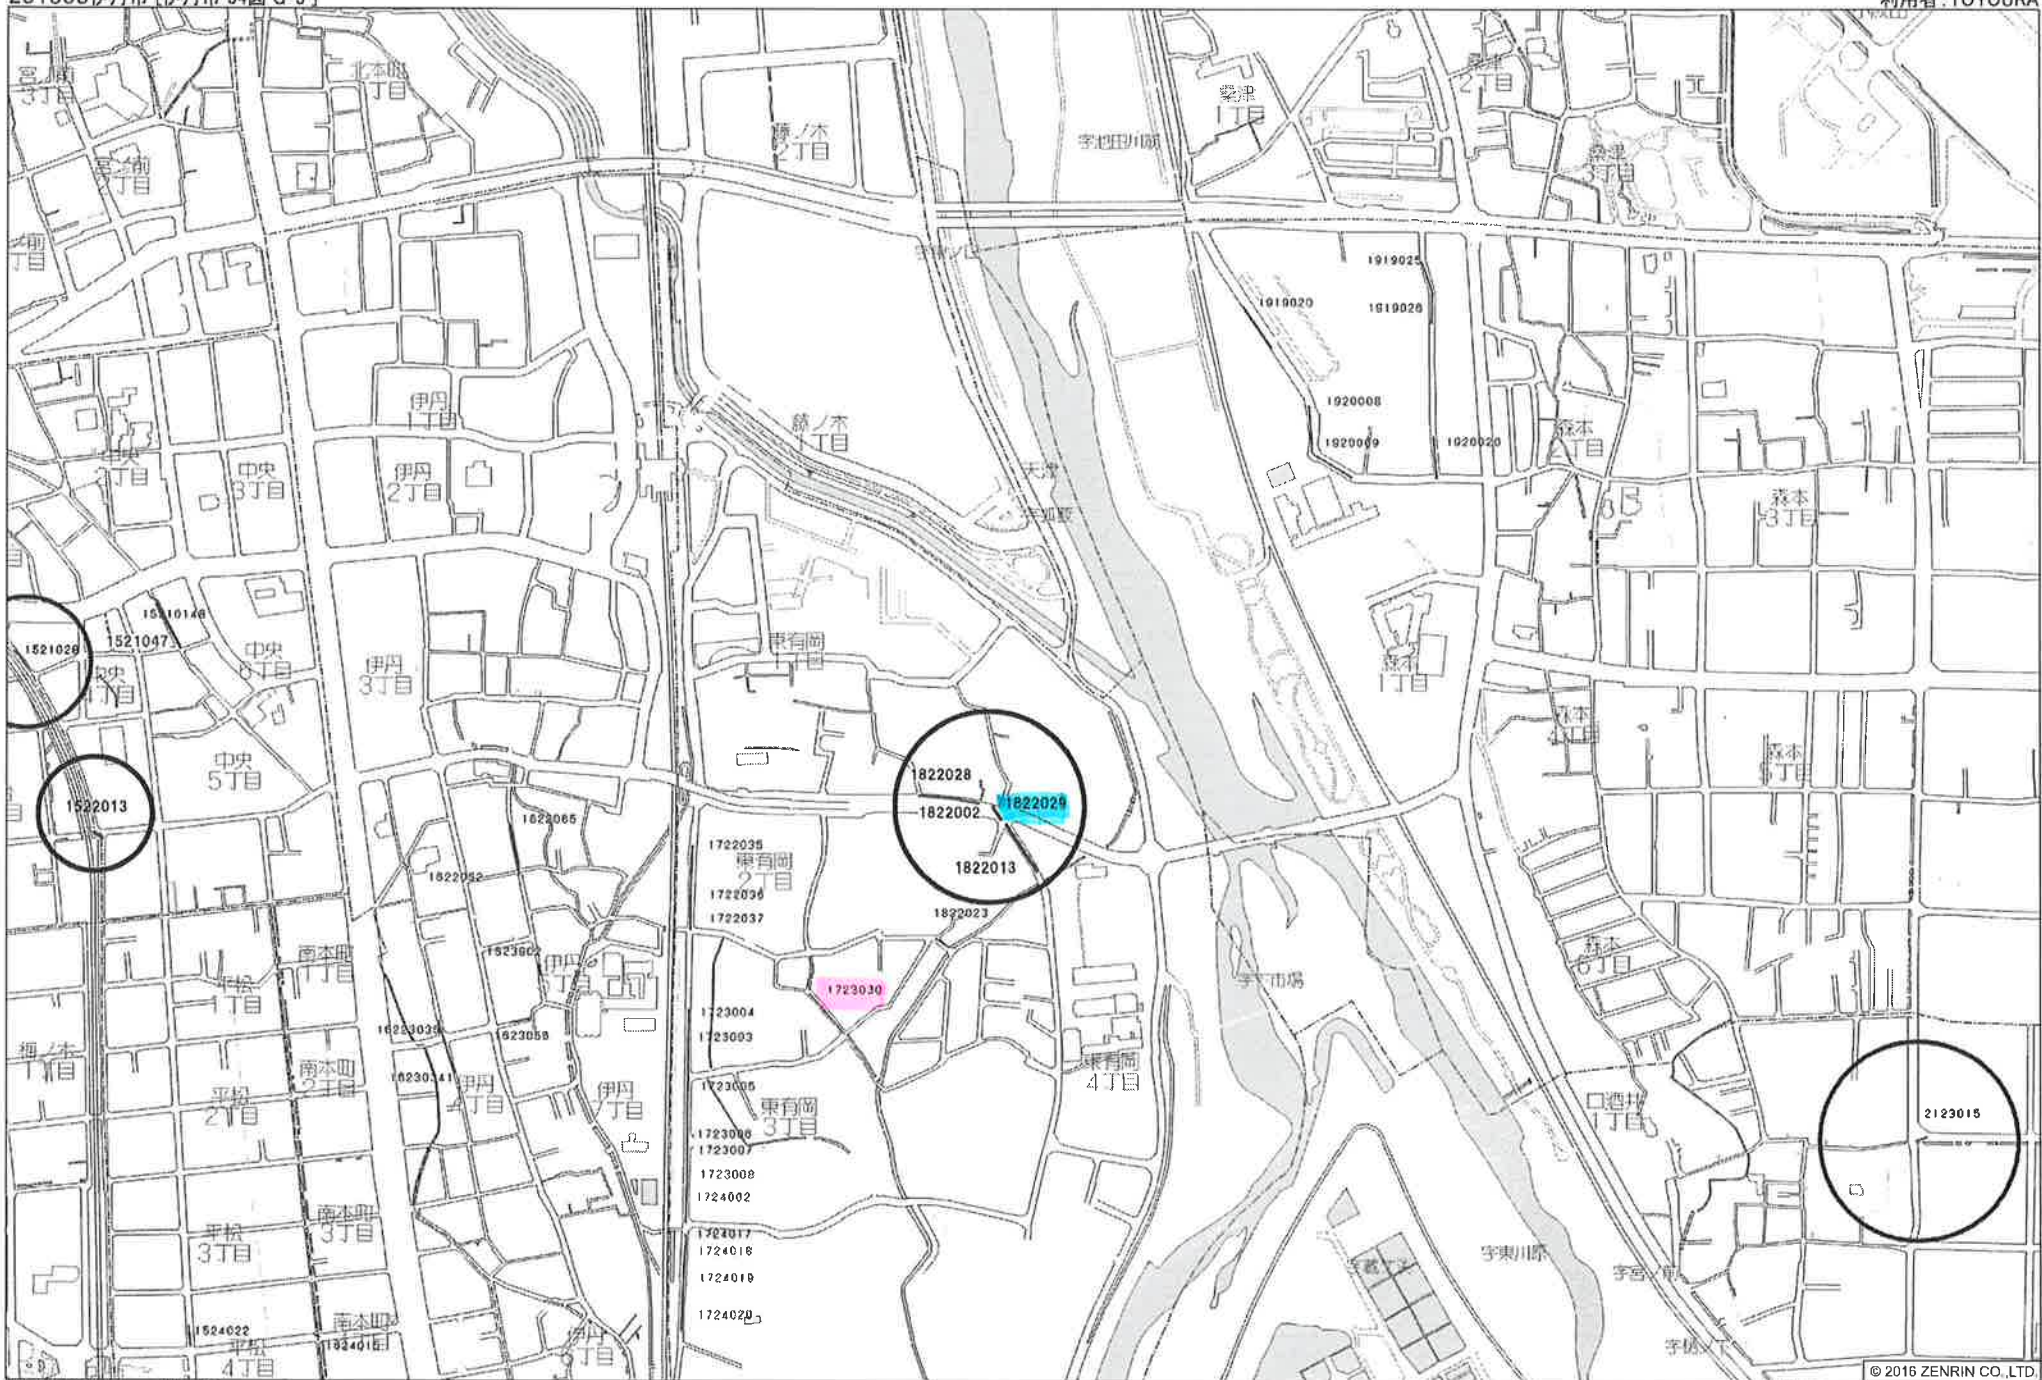

伊丹市東有岡1丁目付近

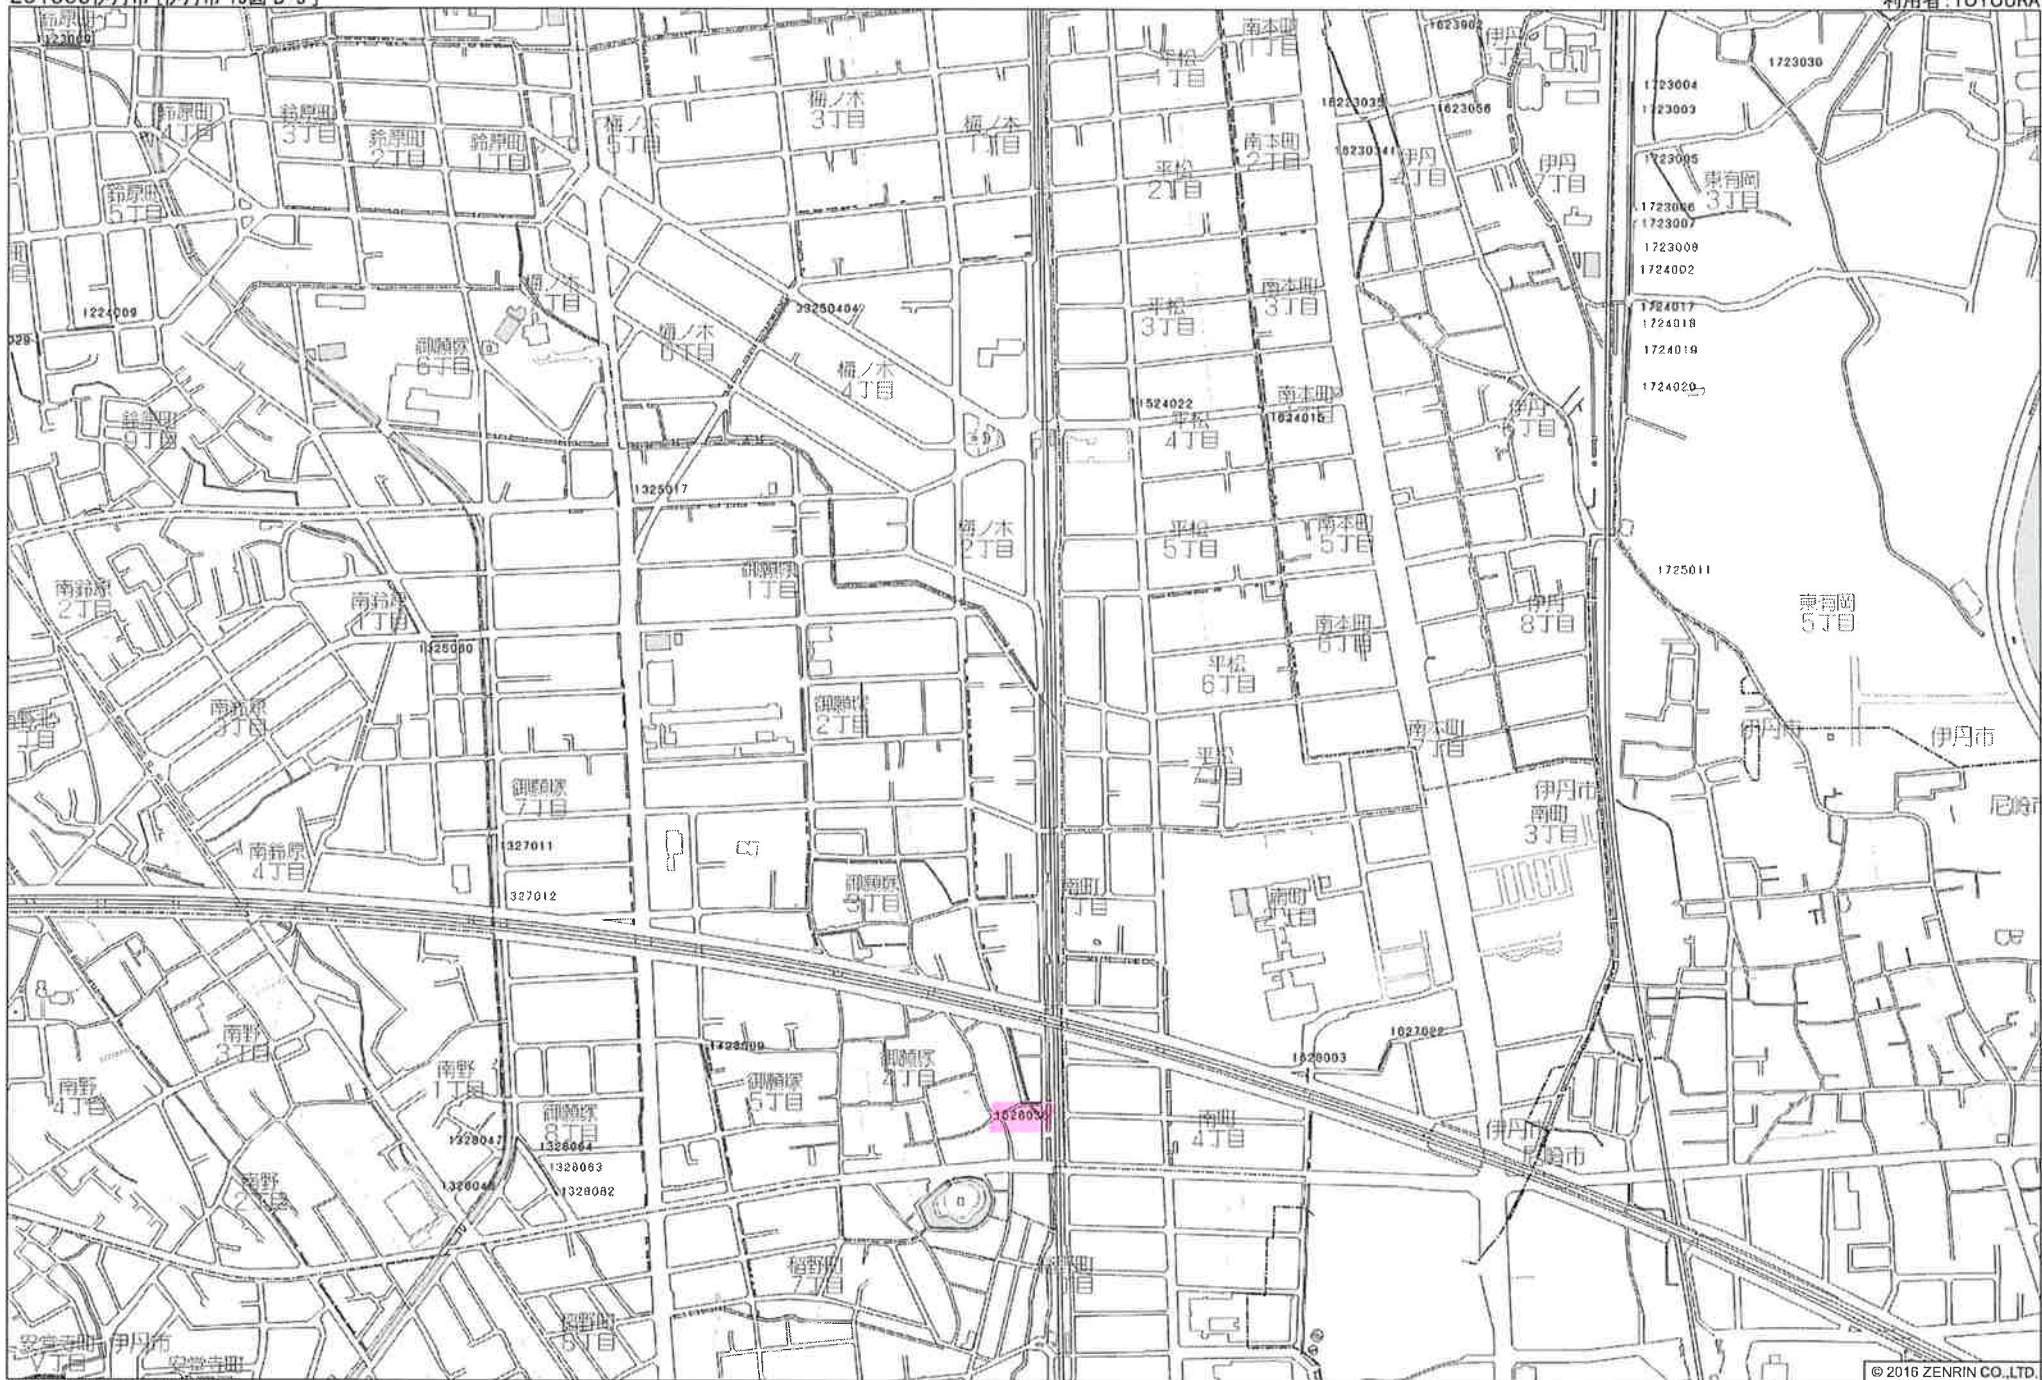

伊丹市御願塚2丁目付近

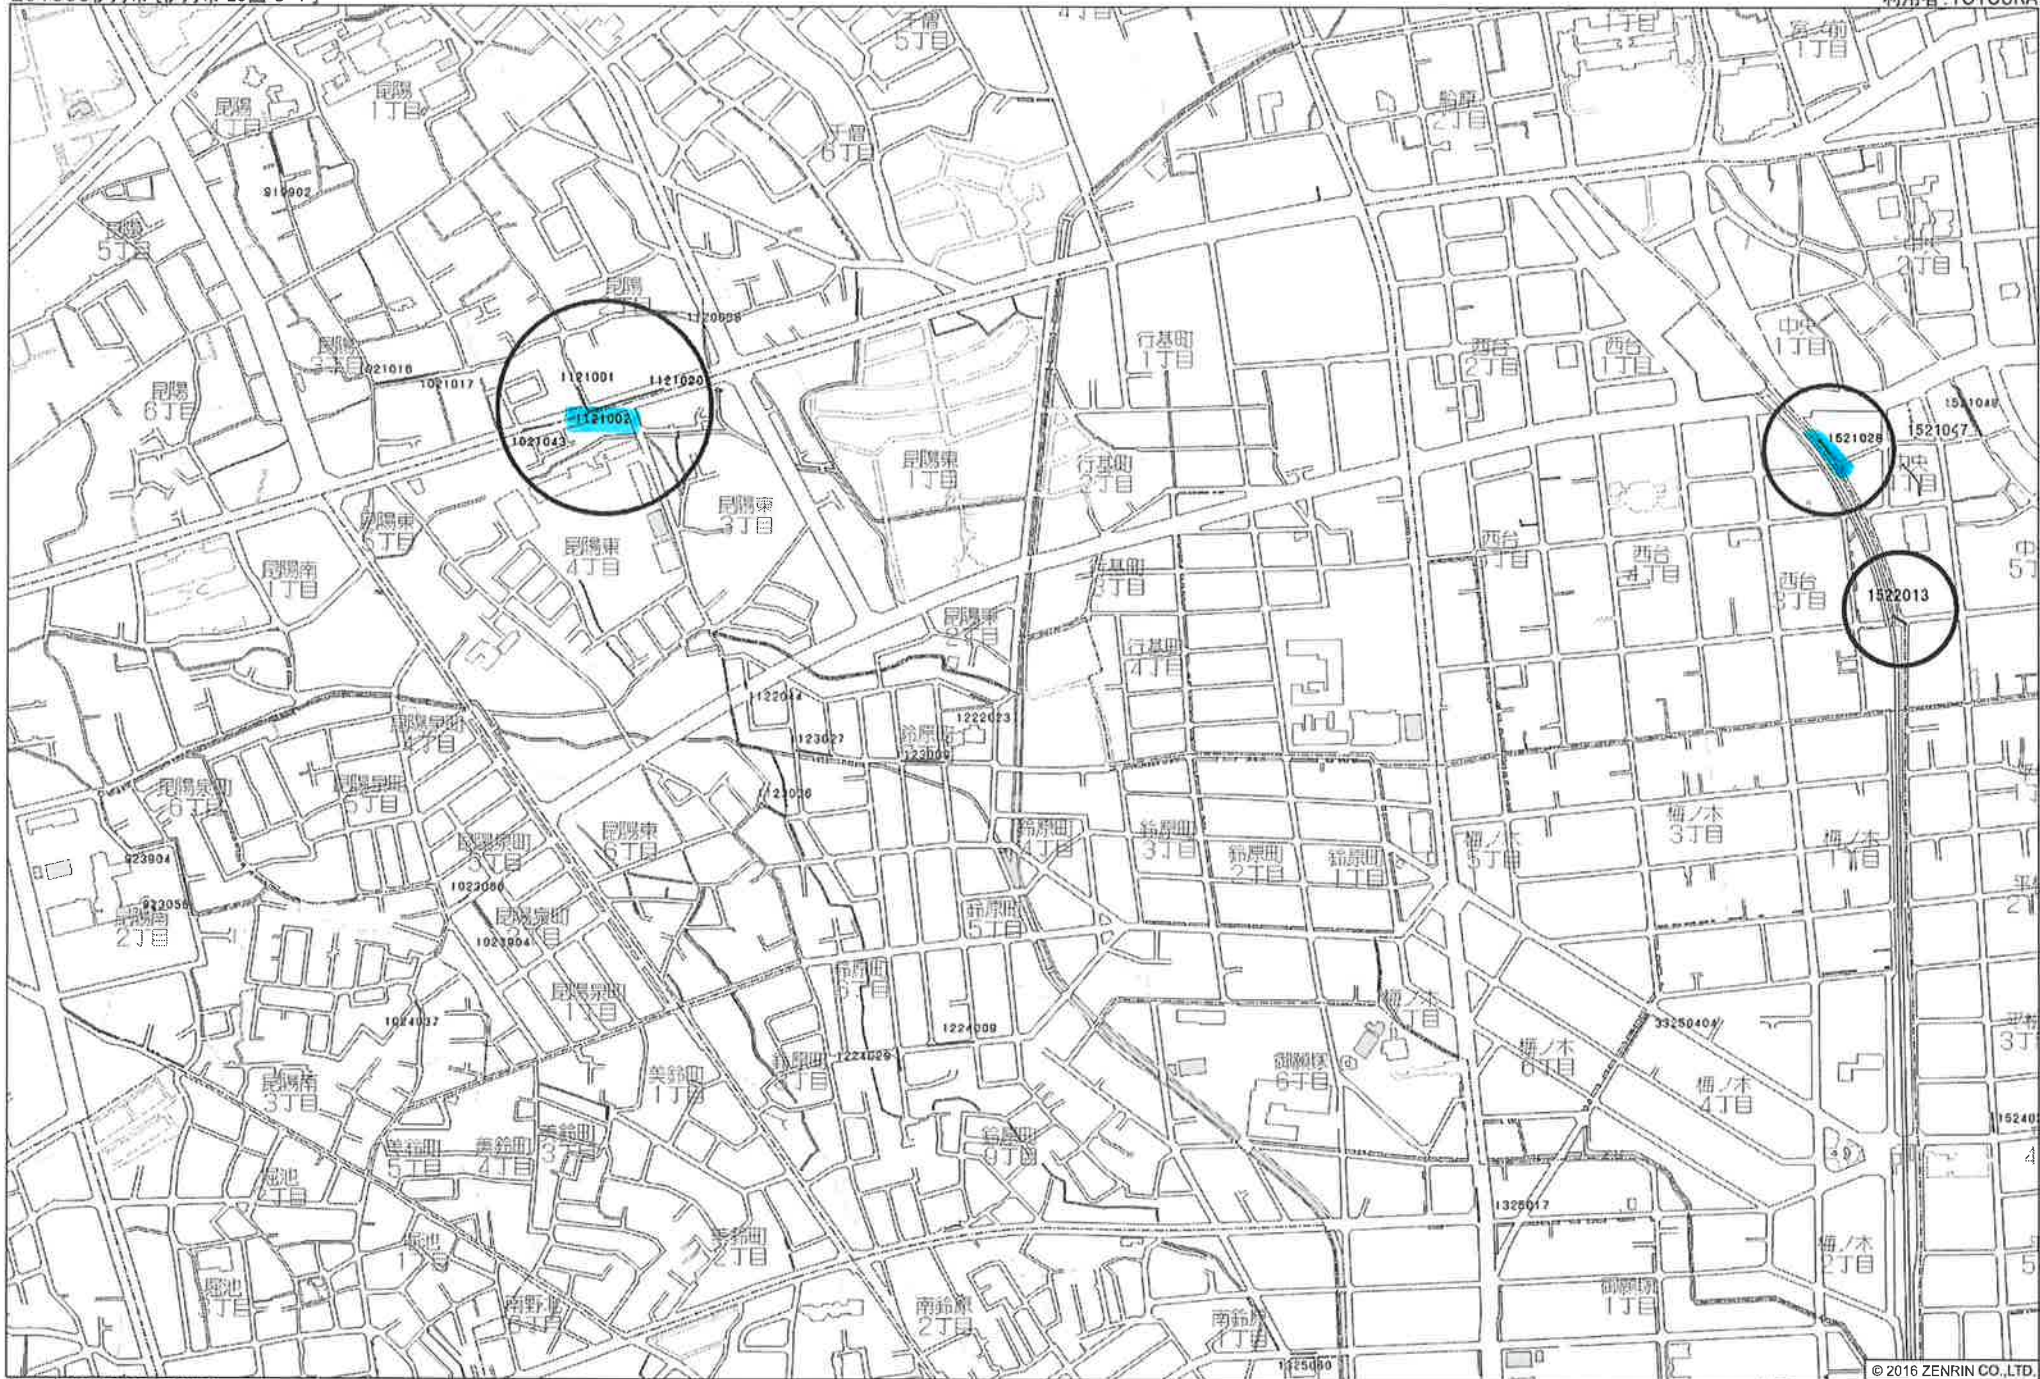

伊丹市鈴原町4丁目付近
