

# 週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	12月		1月					1月							
	6日 月	7日 火	8日 水	9日 木	10日 金	11日 土	12日 日	13日 月	14日 火	15日 水	16日 木	17日 金	18日 土	19日 日	
本施工	森本 1919026	御願塚 1428009							南町 1627022	中央 1522013					
					後処理 昆陽						後処理 東有岡	後処理 東有岡			

凡例 昼間施工  夜間施工

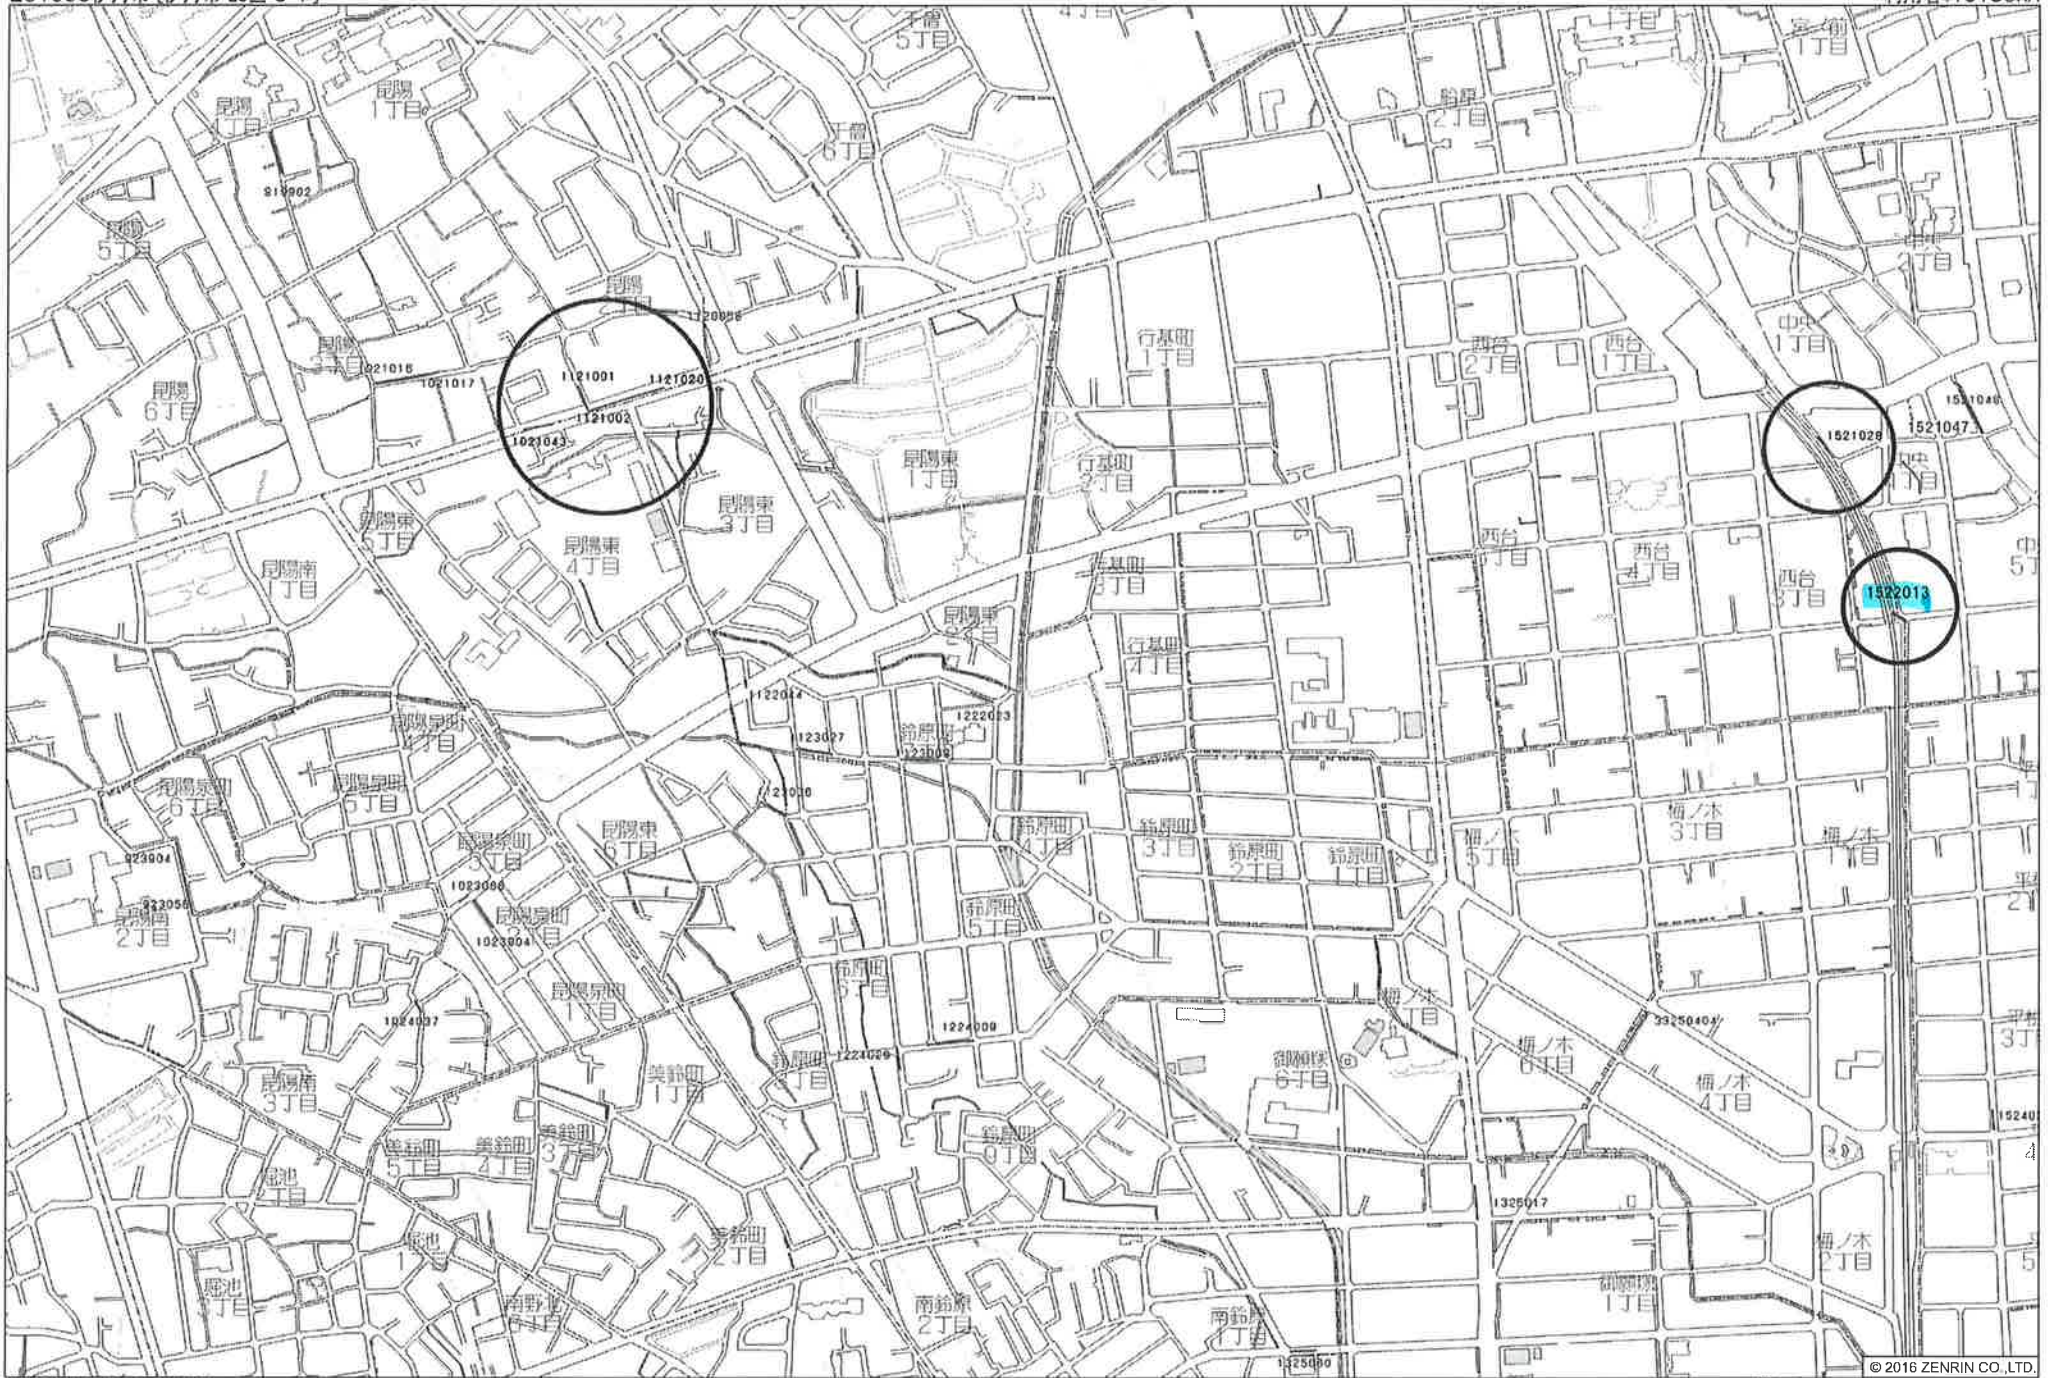

伊丹市錦原町4丁目付近







