

# 週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳


施工場所	(実施)						(予定)								備考
	11月						12月								
	25日 月	26日 火	27日 水	28日 木	29日 金	30日 土	1日 日	2日 月	3日 火	4日 水	5日 木	6日 金	7日 土	8日 日	
本施工	東有岡 1822023	御願塚 1325060	東有岡 1723003	東有岡 1822002	東有岡 1822028			東有岡 1622052	鈴原 1222023	昆陽 1121002	南本町 1724020	南本町 1724017			

凡例 昼間施工  夜間施工

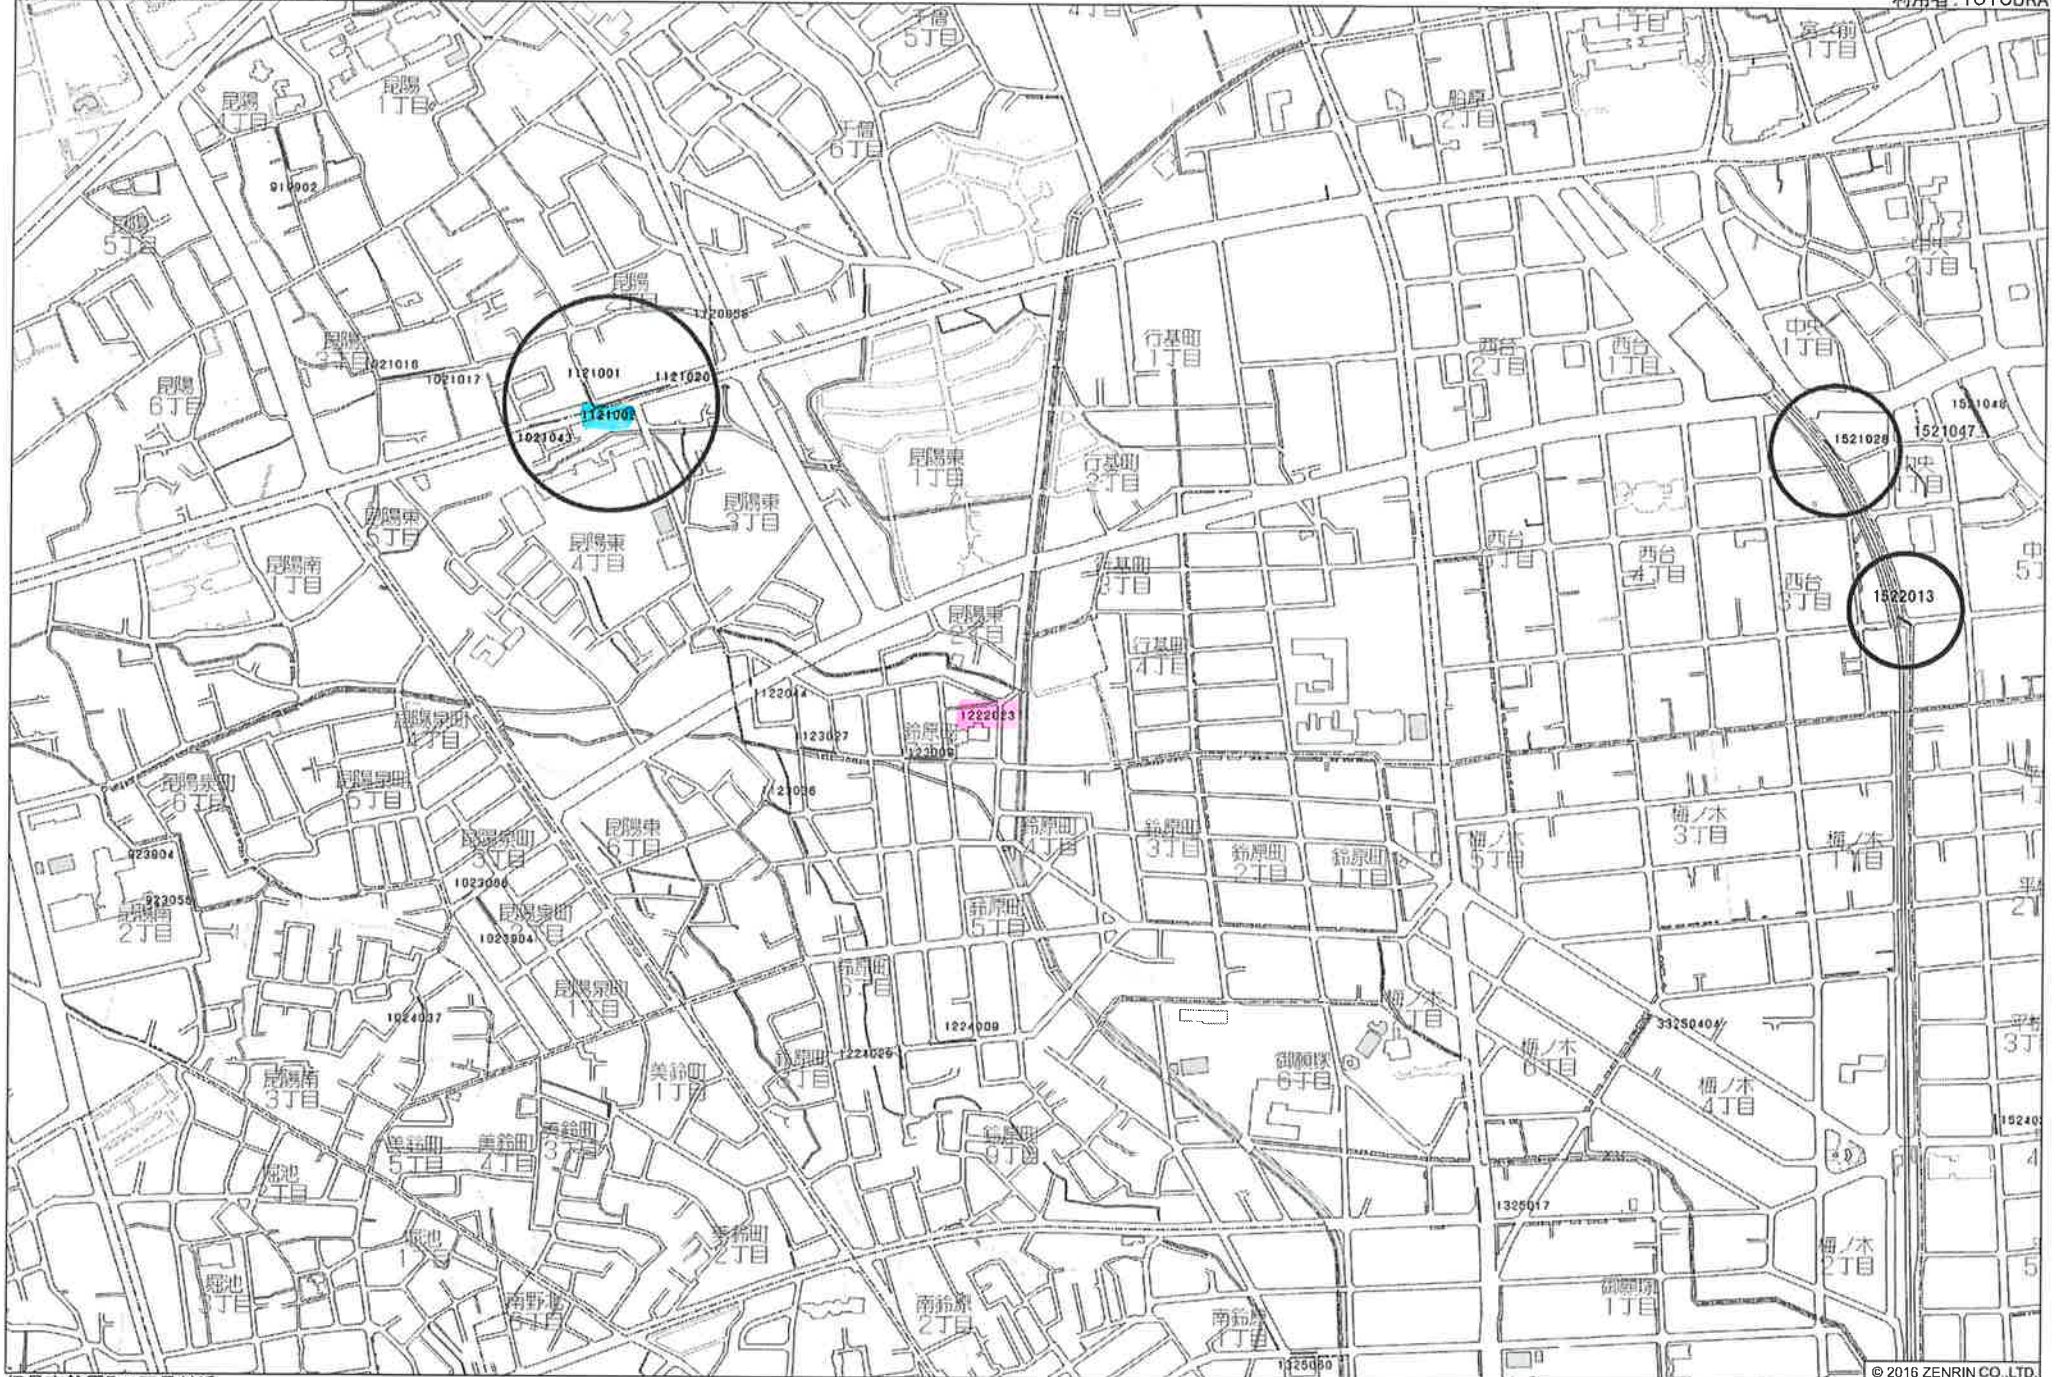

伊丹市鈴原町4丁目付近



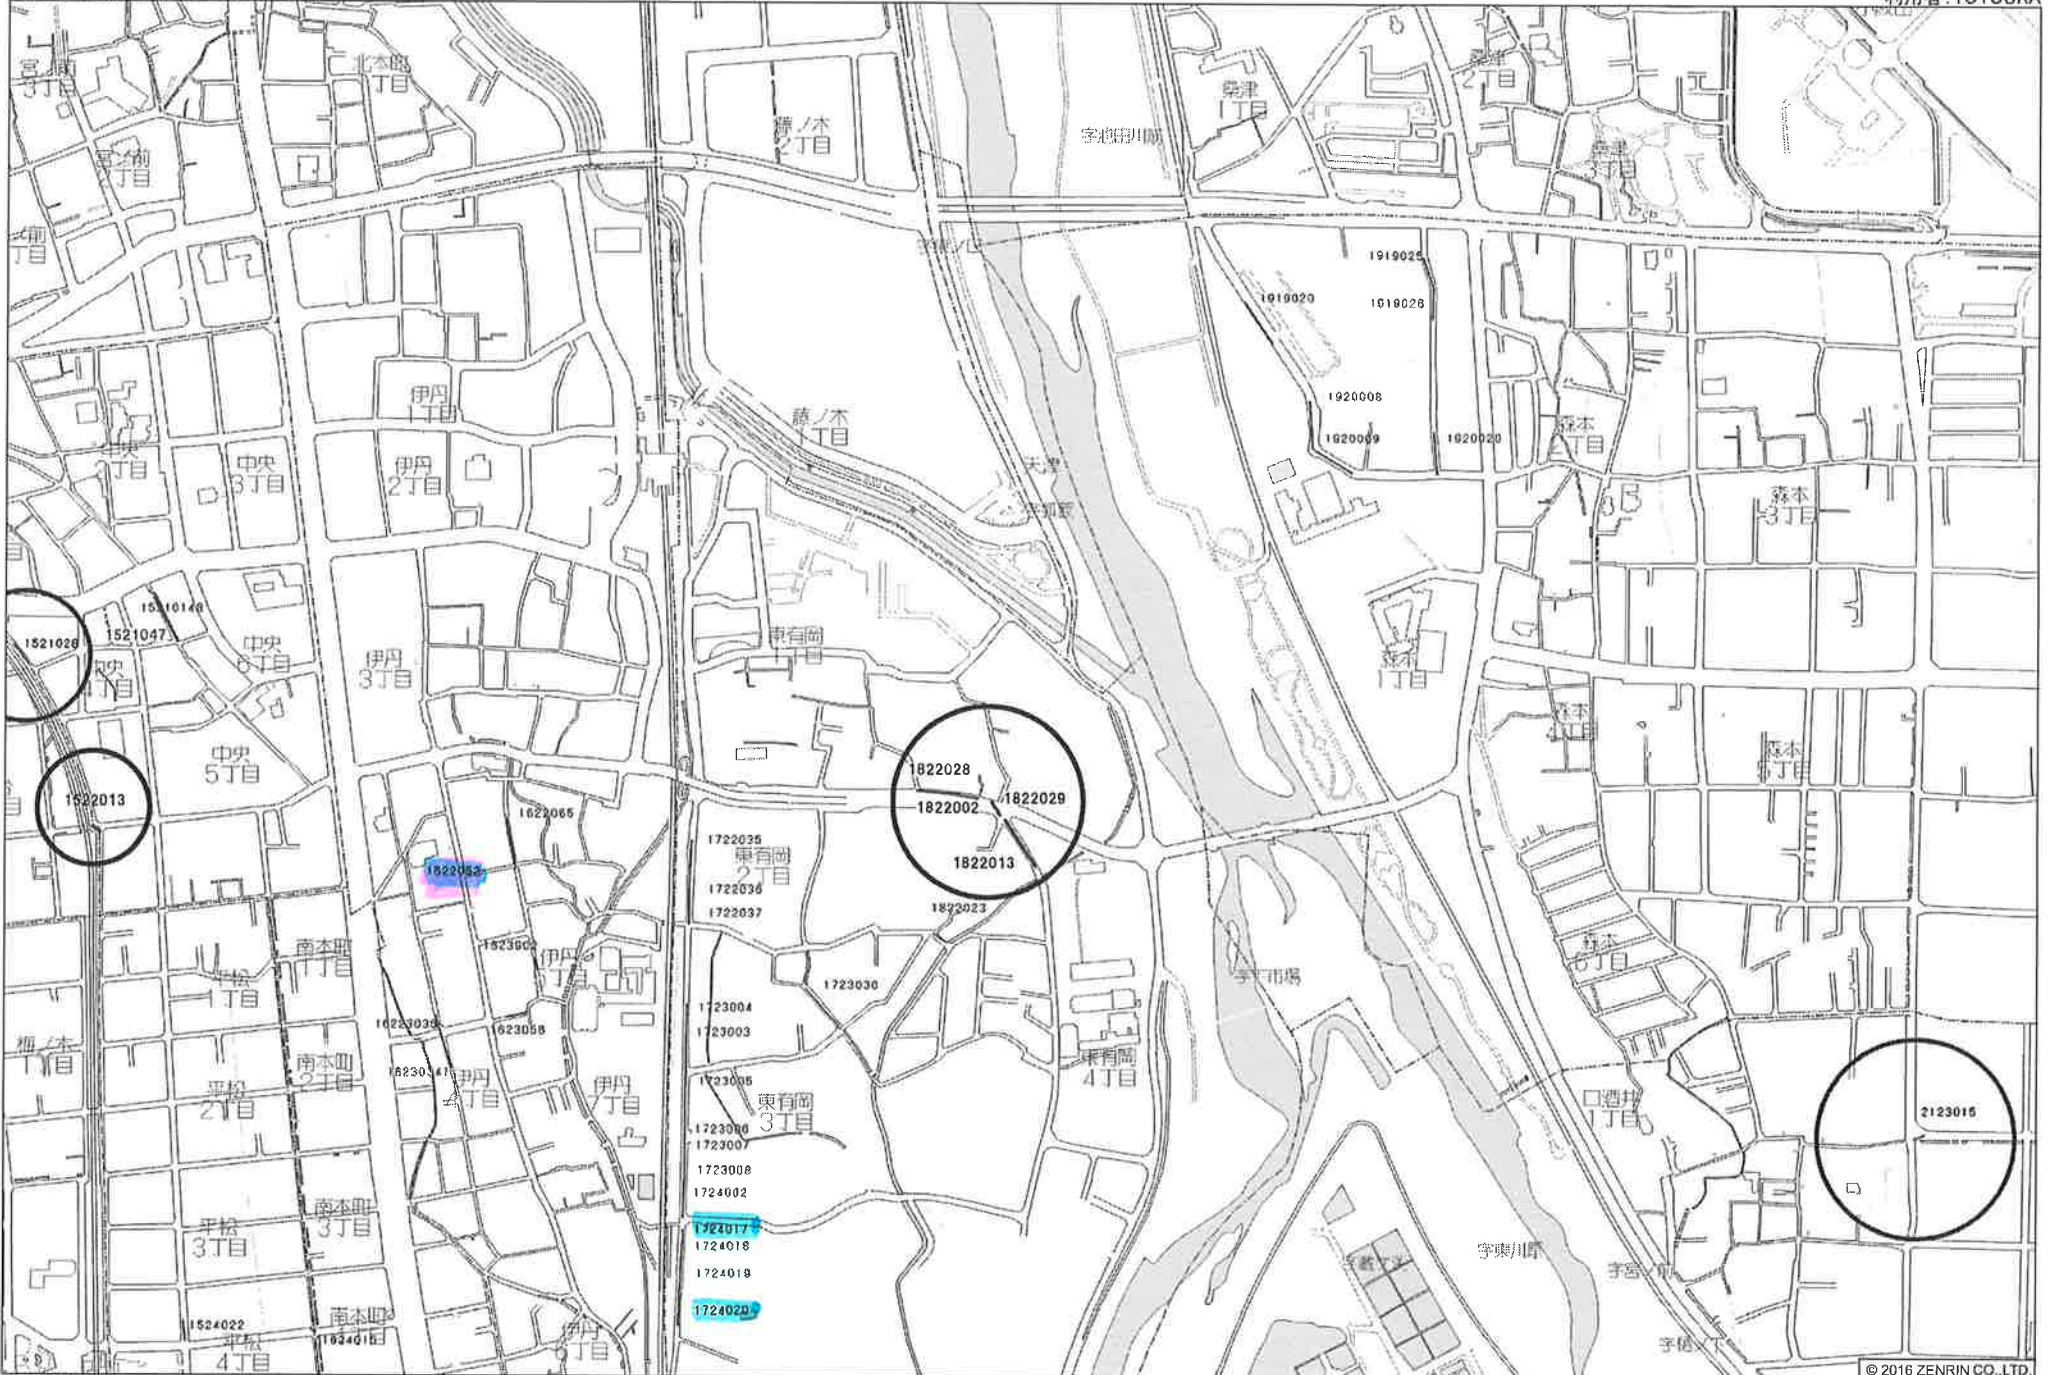

伊丹市東有岡1丁目付近
