

# 週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組


工期 自)令和 元年 6月 25日  
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	11月							12月							
	18日 月	19日 火	20日 水	21日 木	22日 金	23日 土	24日 日	25日 月	26日 火	27日 水	28日 木	29日 金	30日 土	1日 日	
本施工	昆陽泉 1023066	御願塚 1325017			南本町 1723008			東有岡 1822023	御願塚 1325060	東有岡 1723003	東有岡 1822002	東有岡 1822028			
後処理															

凡例 昼間施工  夜間施工



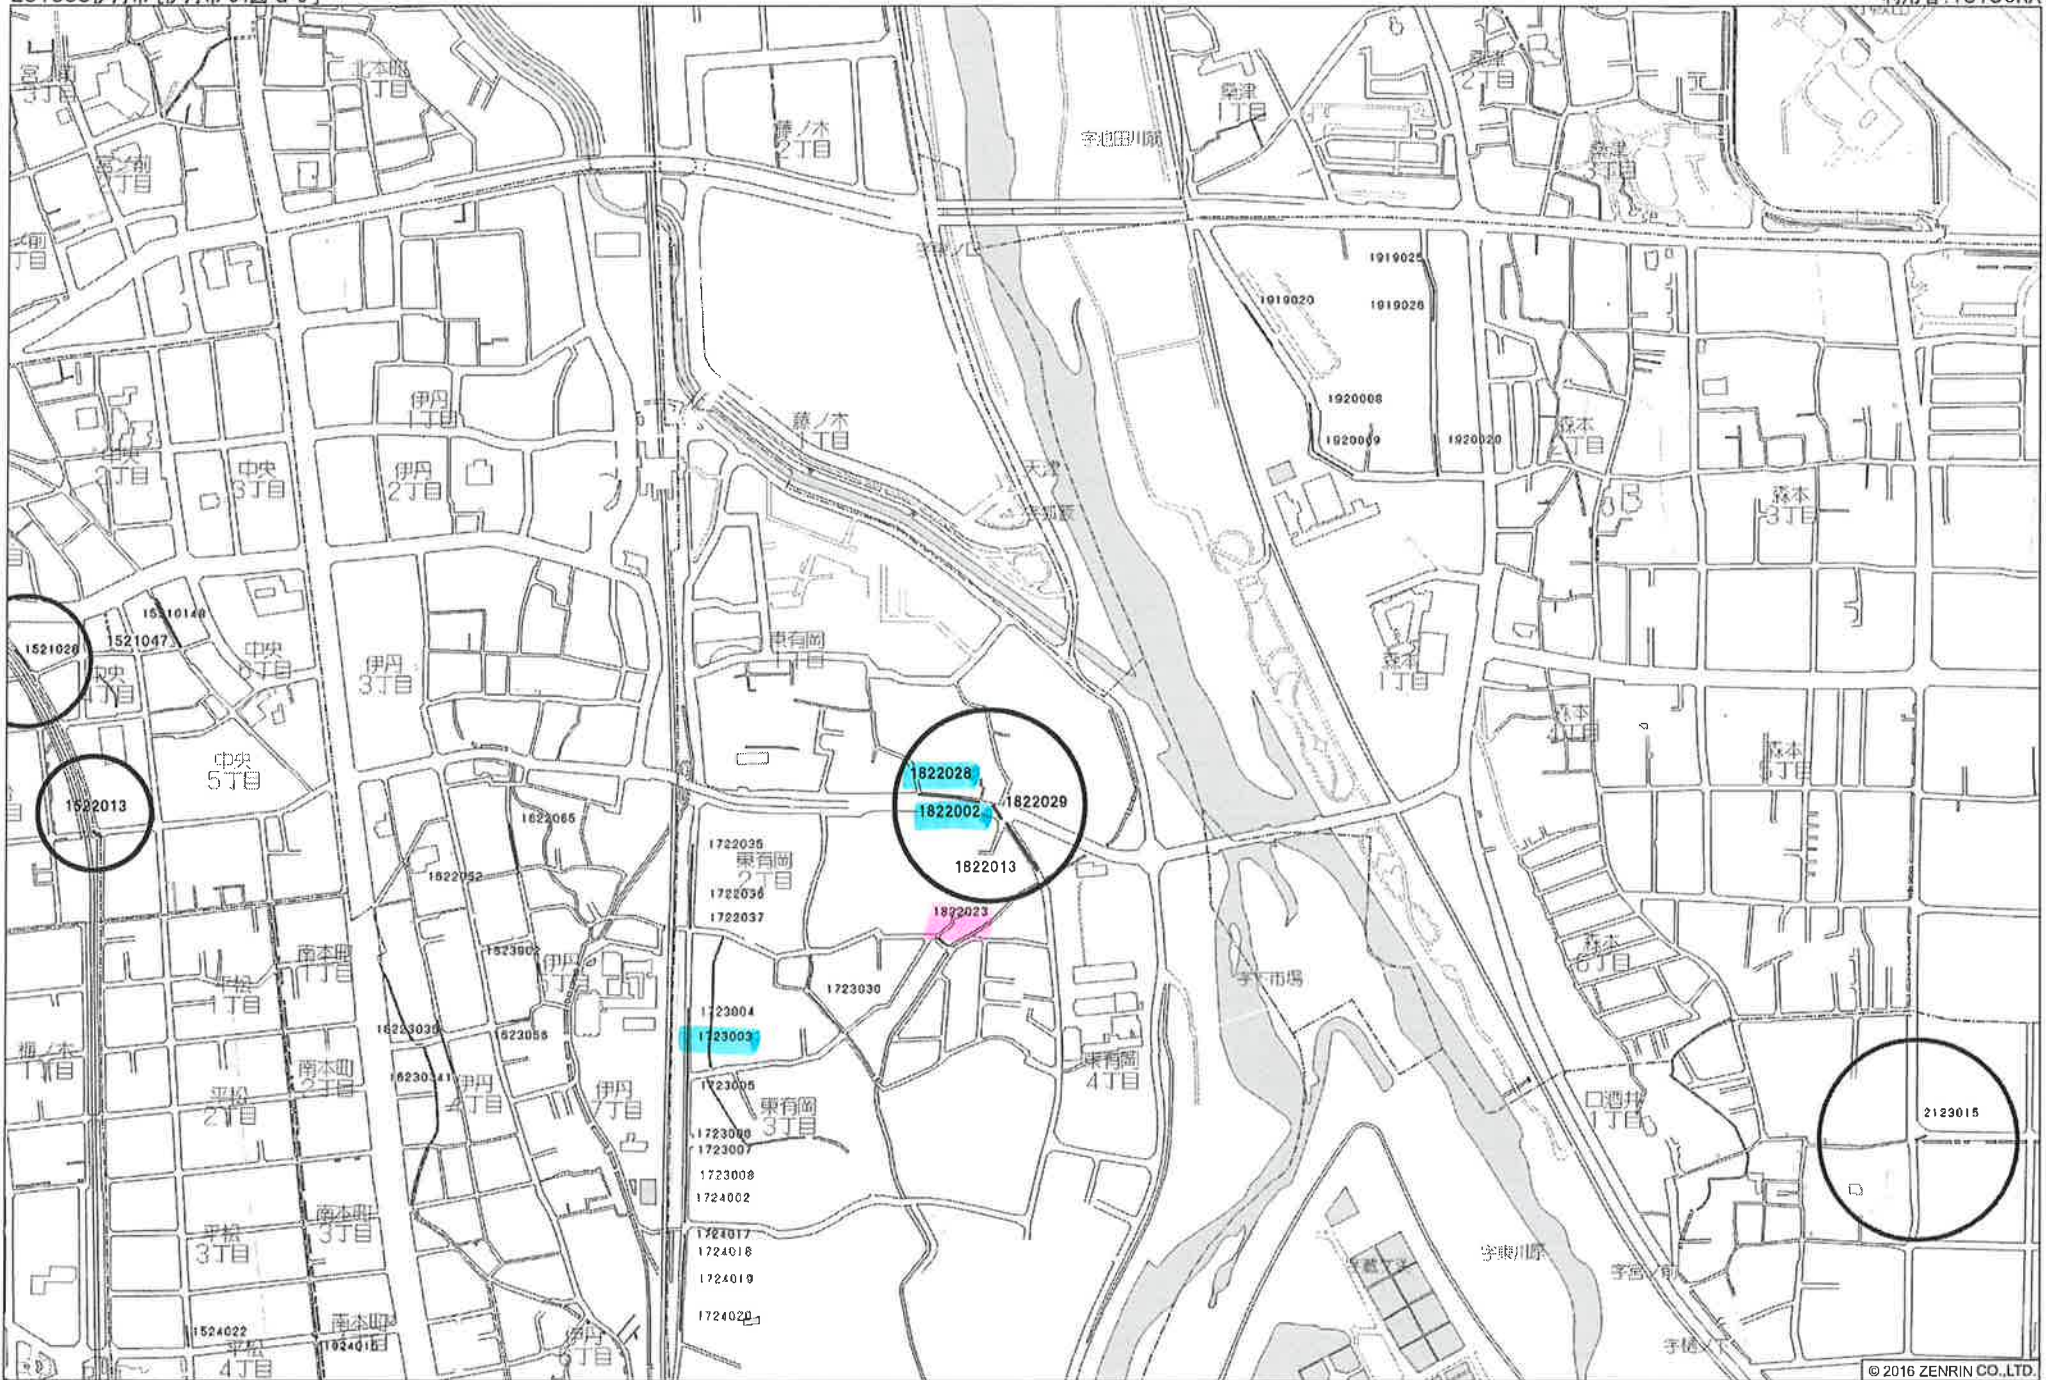

伊丹市東有岡1丁目付近
