

# 週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日


現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	8月							9月							
	26日 月	27日 火	28日 水	29日 木	30日 金	31日 土	1日 日	2日 月	3日 火	4日 水	5日 木	6日 金	7日 土	8日 日	
事前調査工	森本 1920020 1919025 1919026 御願塚① 1428009 南町 1627022	中央 1521028 1522013 1521048 1521047 南町 1528036			夜間施工 東有岡④ 1822029 1822028 1822002 1822013										
前処理									御願塚① 1327011 1327012 1328062 1328063 1328064	昆陽 919902 1021016 1021017 南町 1628003 南本町 1524022 1624015	昆陽泉町 1023904 1024037 東有岡④ 1623035 16230341				

凡例 昼間施工  夜間施工





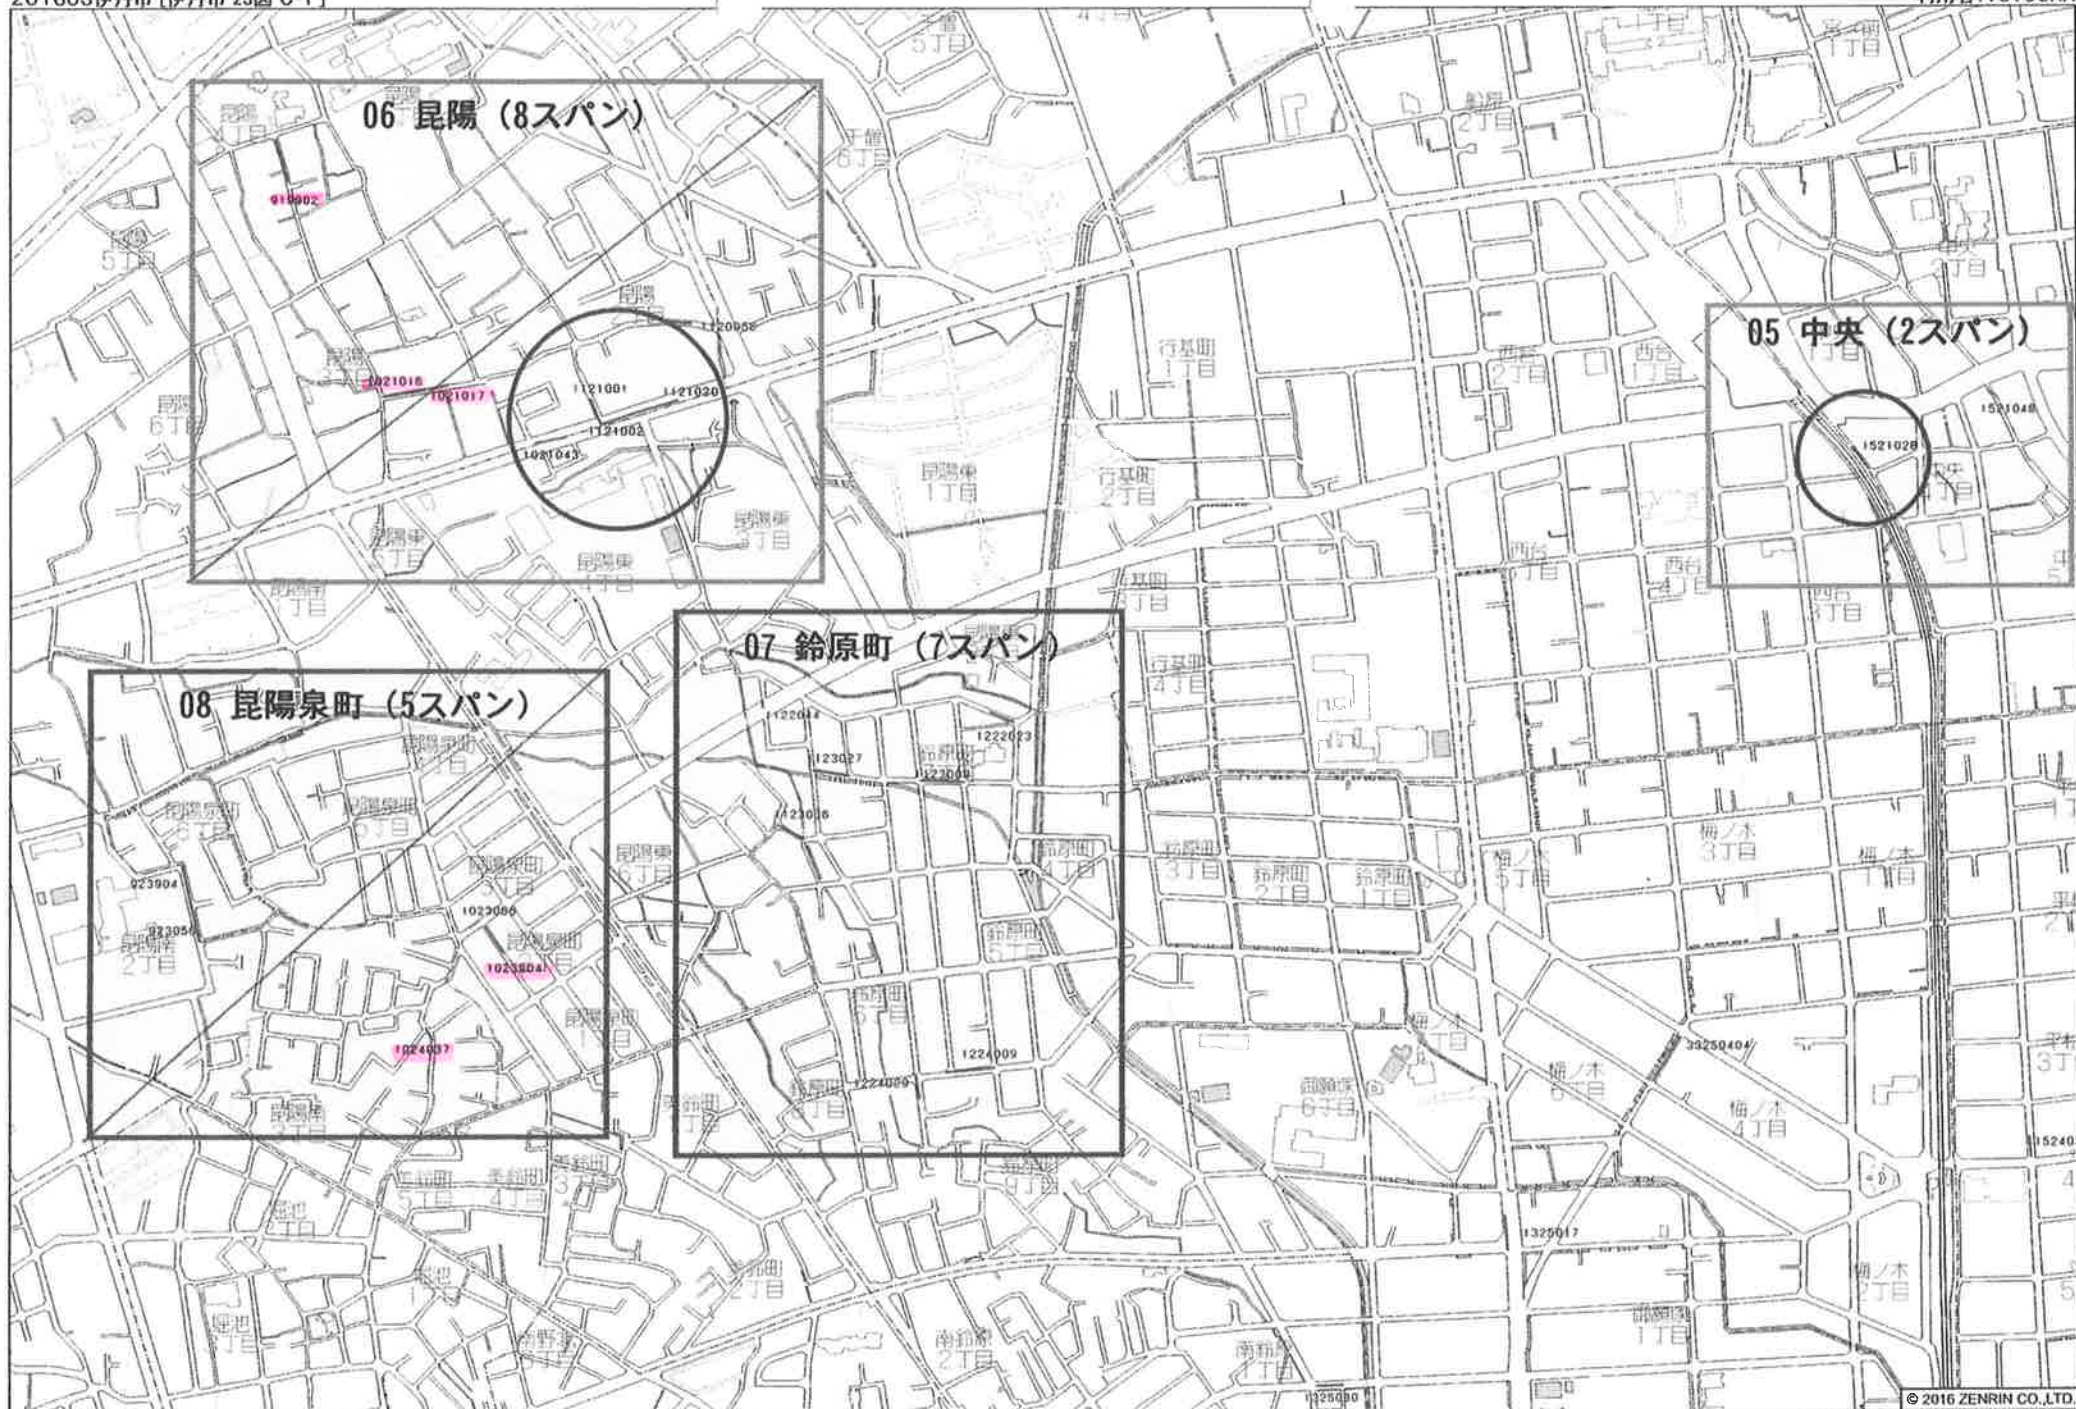





伊丹市御願塚2丁目付近
