

# 週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事


工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	9月							9月							
	2日 月	3日 火	4日 水	5日 木	6日 金	7日 土	8日 日	9日 月	10日 火	11日 水	12日 木	13日 金	14日 土	15日 日	
前処理			御願塚⑤ 1327011 1327012 1328062 1328063 1328064	昆陽 919902 1021016 1021017 南町 1628003 南本町 1524022 1624015	昆陽泉町 1023904 1024037 昆陽 1120056			東有岡④ 1623035 16230341 昆陽泉町 923904 923056 1023066	鈴原町 1224029 1224009 御願塚⑤ 1325060 1325017	御願塚⑤ 1328047 1328048 森本 1919020 1920008 1920009	東有岡④ 1722035 1722036 1722037 1723004 1723003	東有岡④ 1723005 1723006 南本町 1723007 1723008 1724002			


凡例 昼間施工  夜間施工

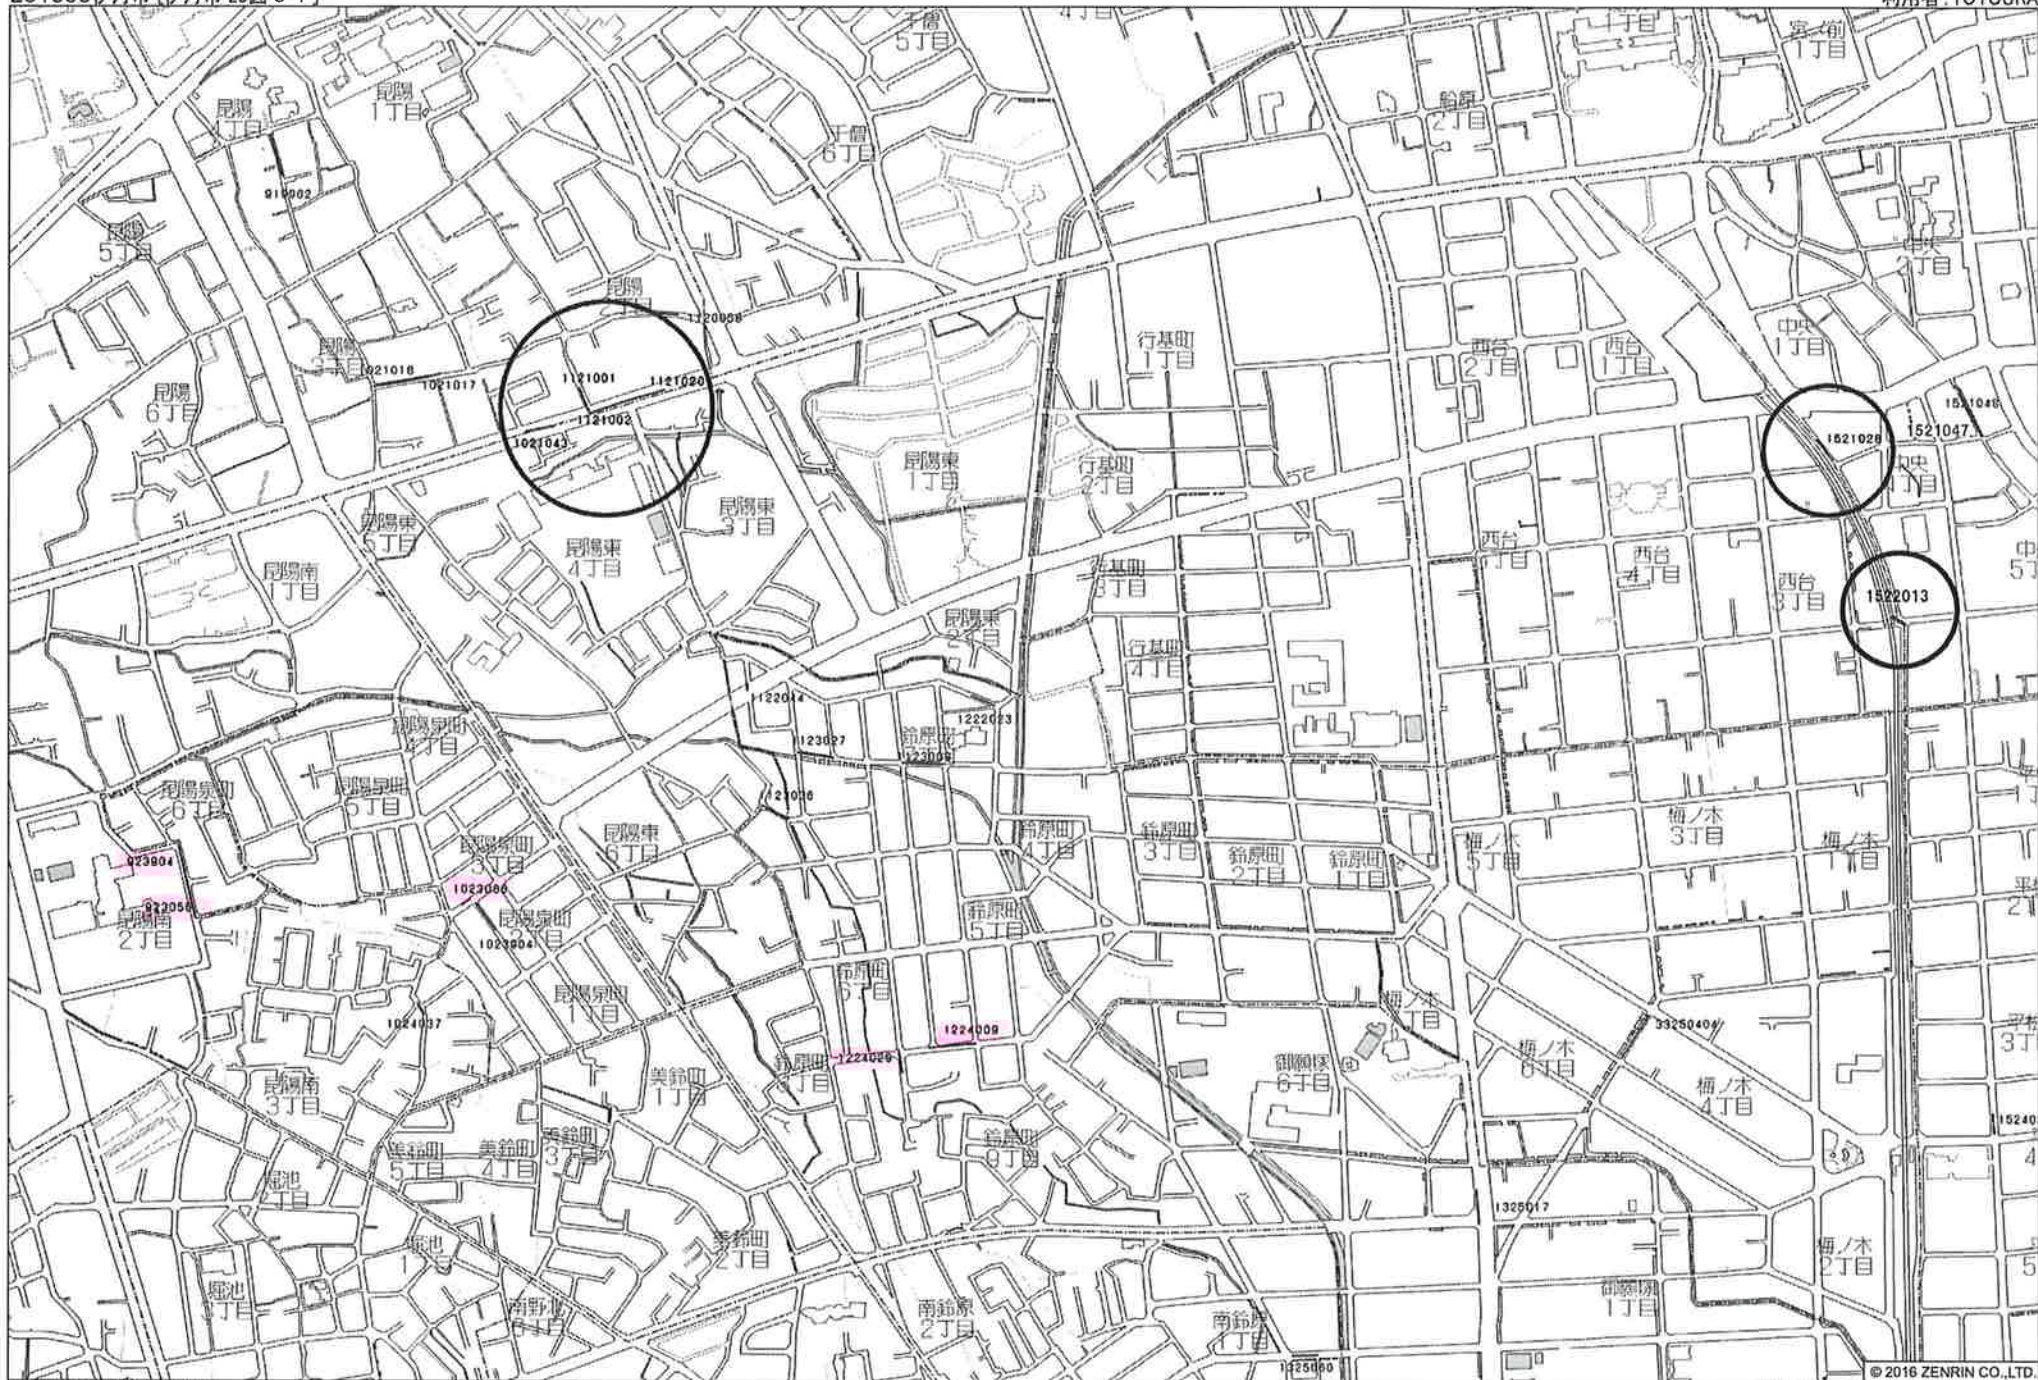

伊丹市鈴原町4丁目付近



伊丹市御願塚2丁目付近

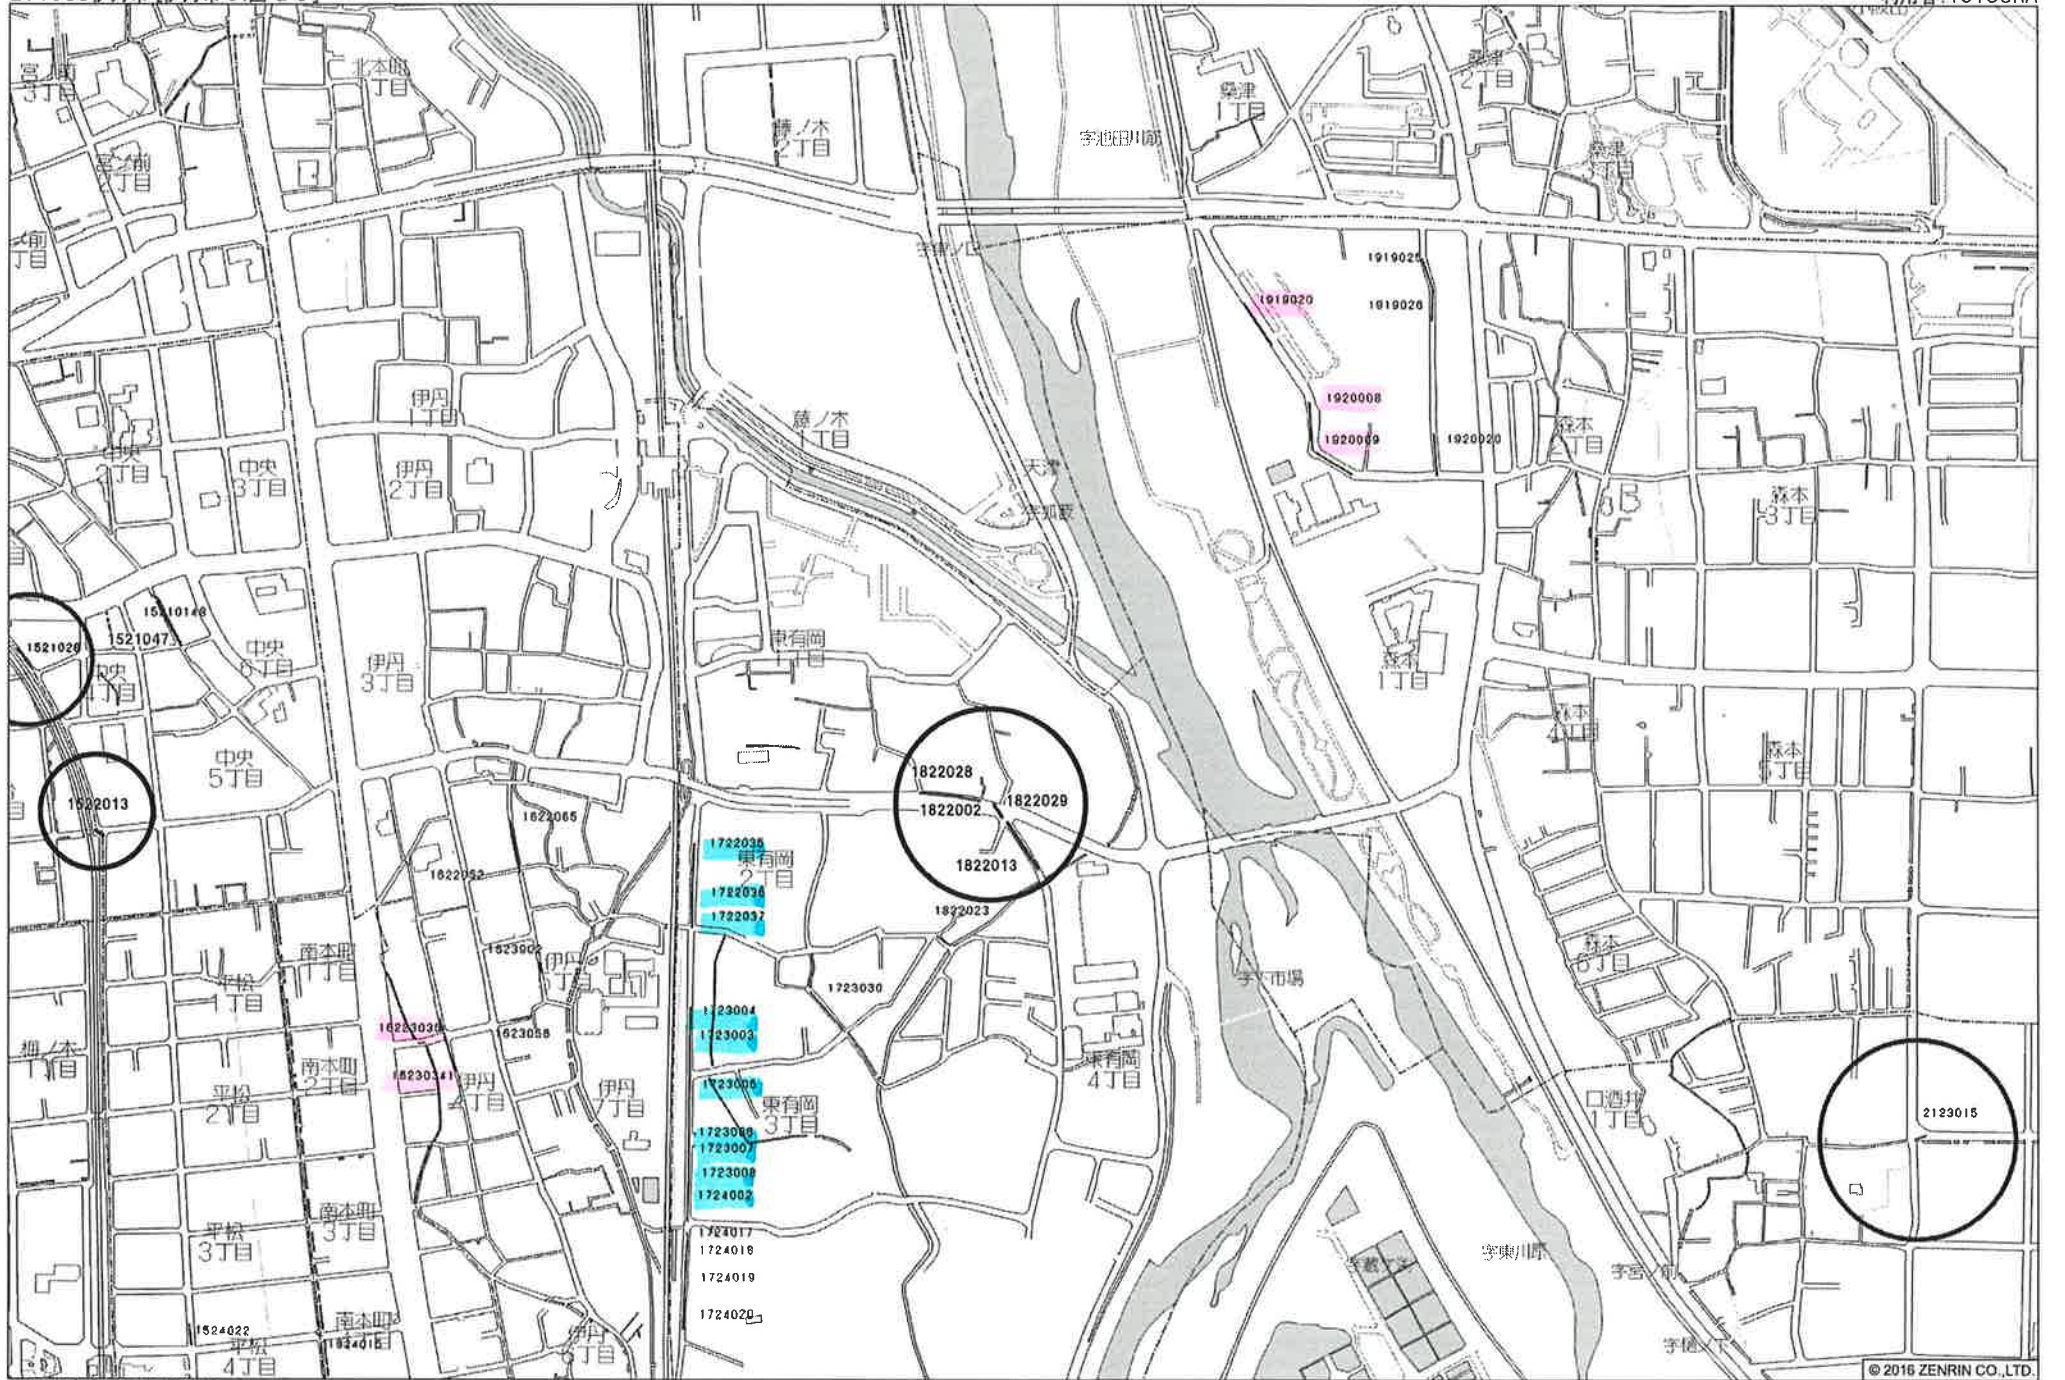

伊丹市東有岡1丁目付近
