

週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿


工事名 東有岡地区管渠更生工事

工期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	7月							7月							
	22日 月	23日 火	24日 水	25日 木	26日 金	27日 土	28日 日	29日 月	30日 火	31日 水	1日 木	2日 金	3日 土	4日 日	
事前調査工															
									鈴原町 1224029	御願塚㊦ 1327011	南本町 1524022	昆陽泉町 923904			
									1224029	1327012	1624015	1024037			
									御願塚㊧ 1325017	1328047	昆陽 919902				
									1325060	1328062	1021016				
									33250404	1328063	1021017				
										1328064	1120056				
											南町 1628003				

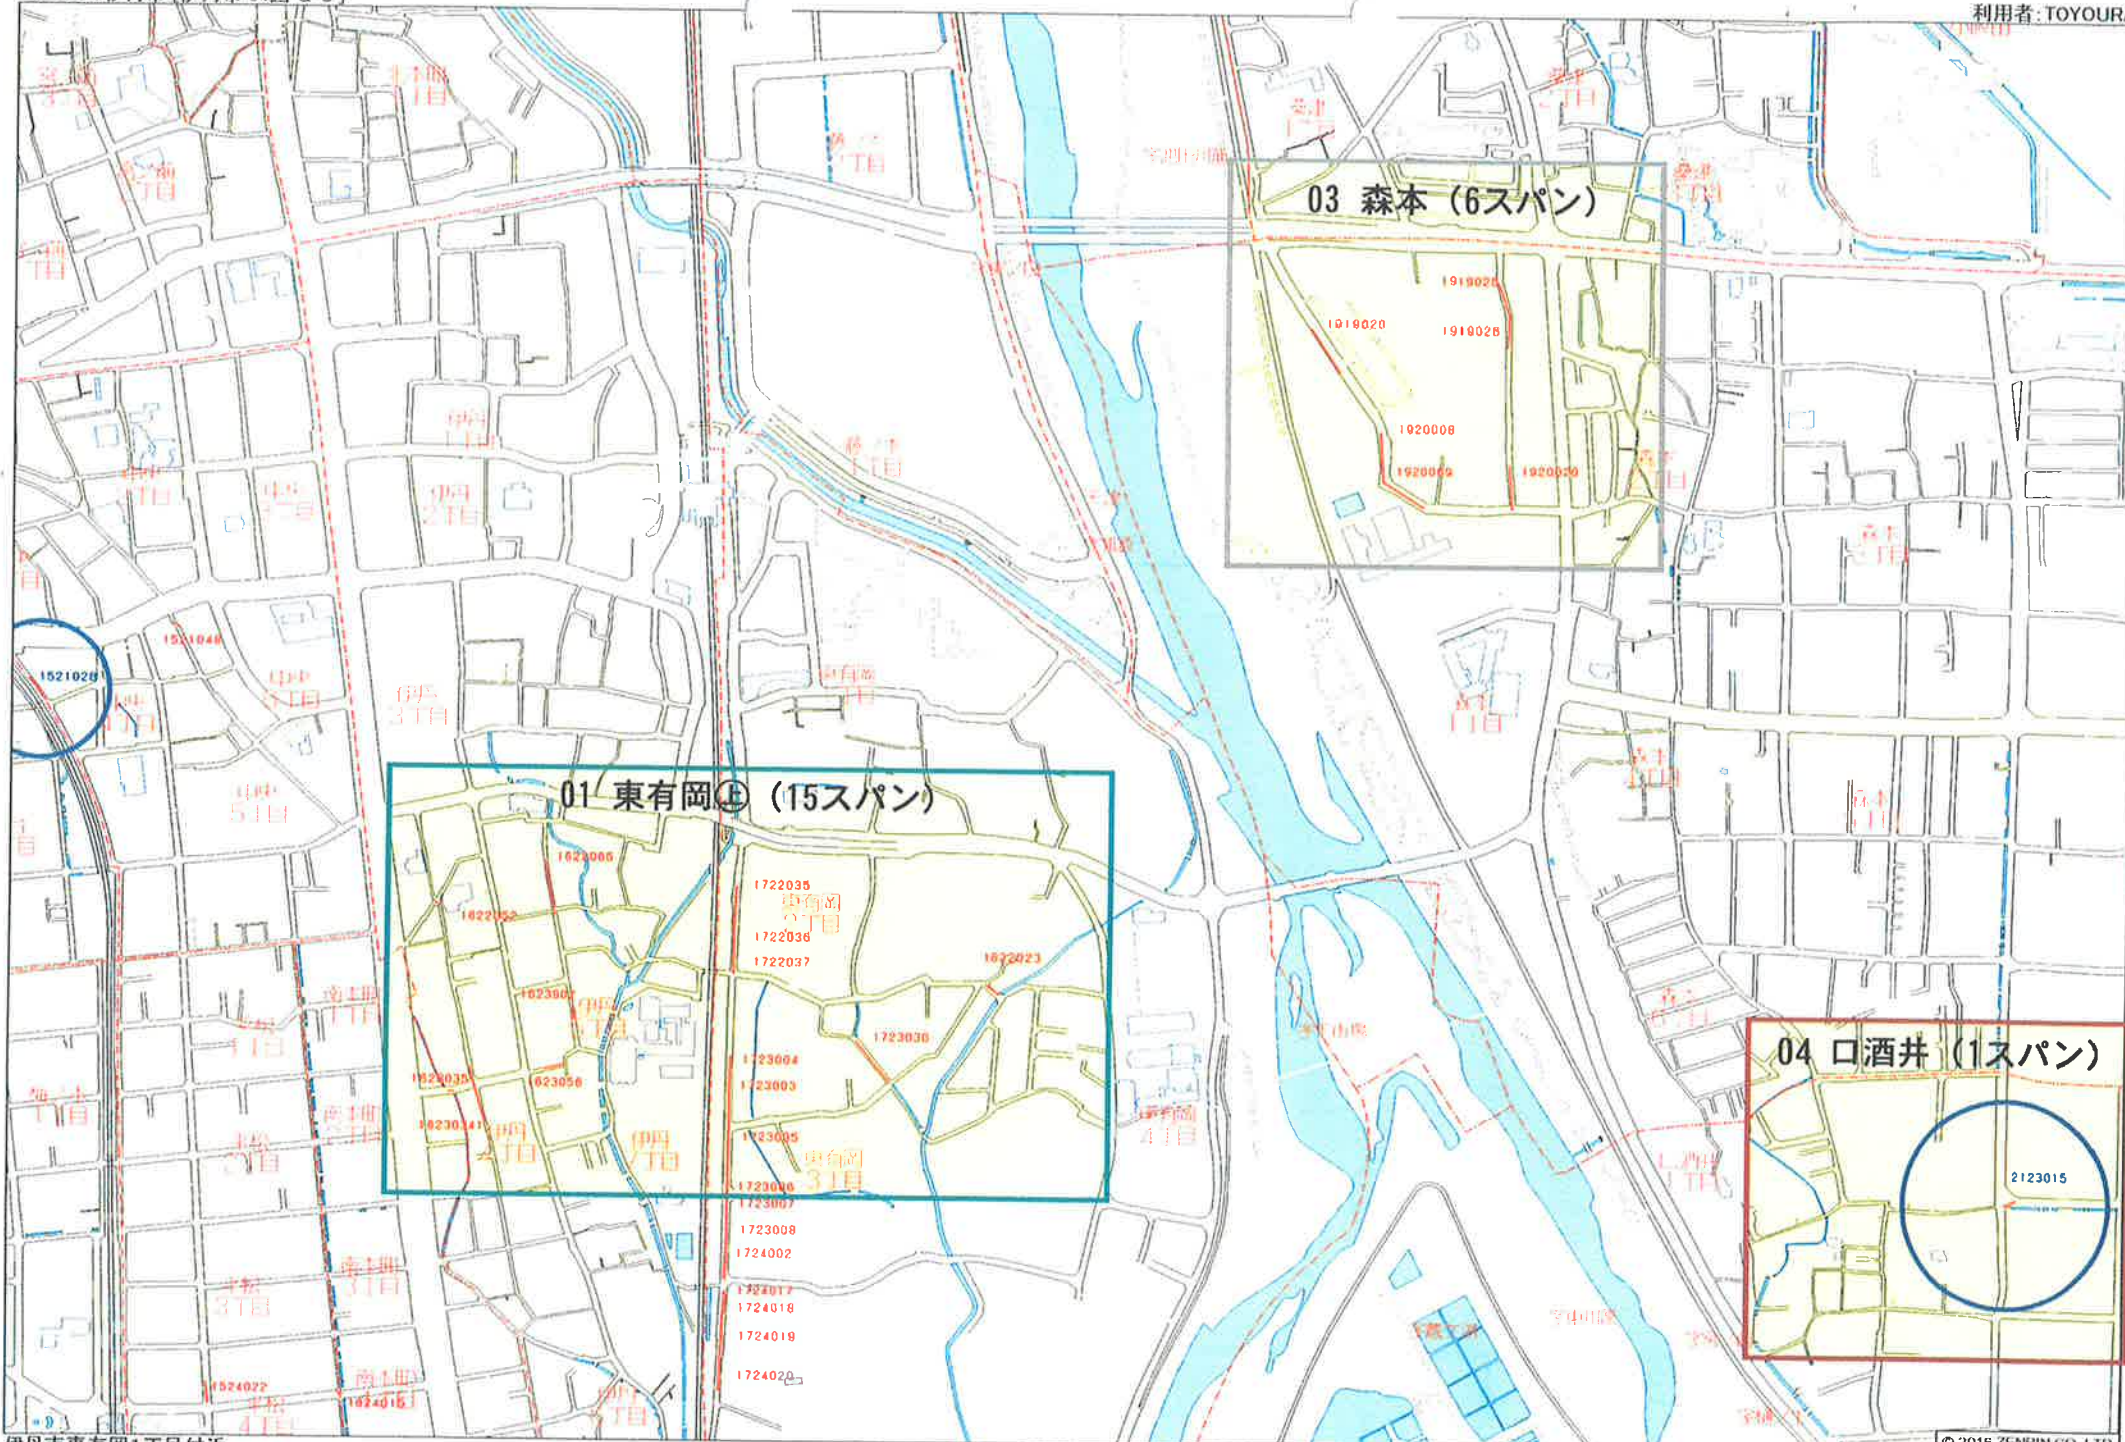

伊丹市東有岡1丁目付近

