

週 間 工 程 表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工 事 名 東有岡地区管渠更生工事

工 期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日

請 負 者 株式会社 神島組


現 場 代 理 人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備 考
	12月														
	16日 月	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	23日 月	24日 火	25日 水	26日 木	27日 金	28日 土	29日 日	
本施工	東有岡 1723030	南町 1528036	中央 1521028	東有岡 1822029	昆陽 1121002										
							後処理	後処理	後処理	後処理	後処理				


凡例 昼間施工 夜間施工



伊丹市御願塚2丁目付近

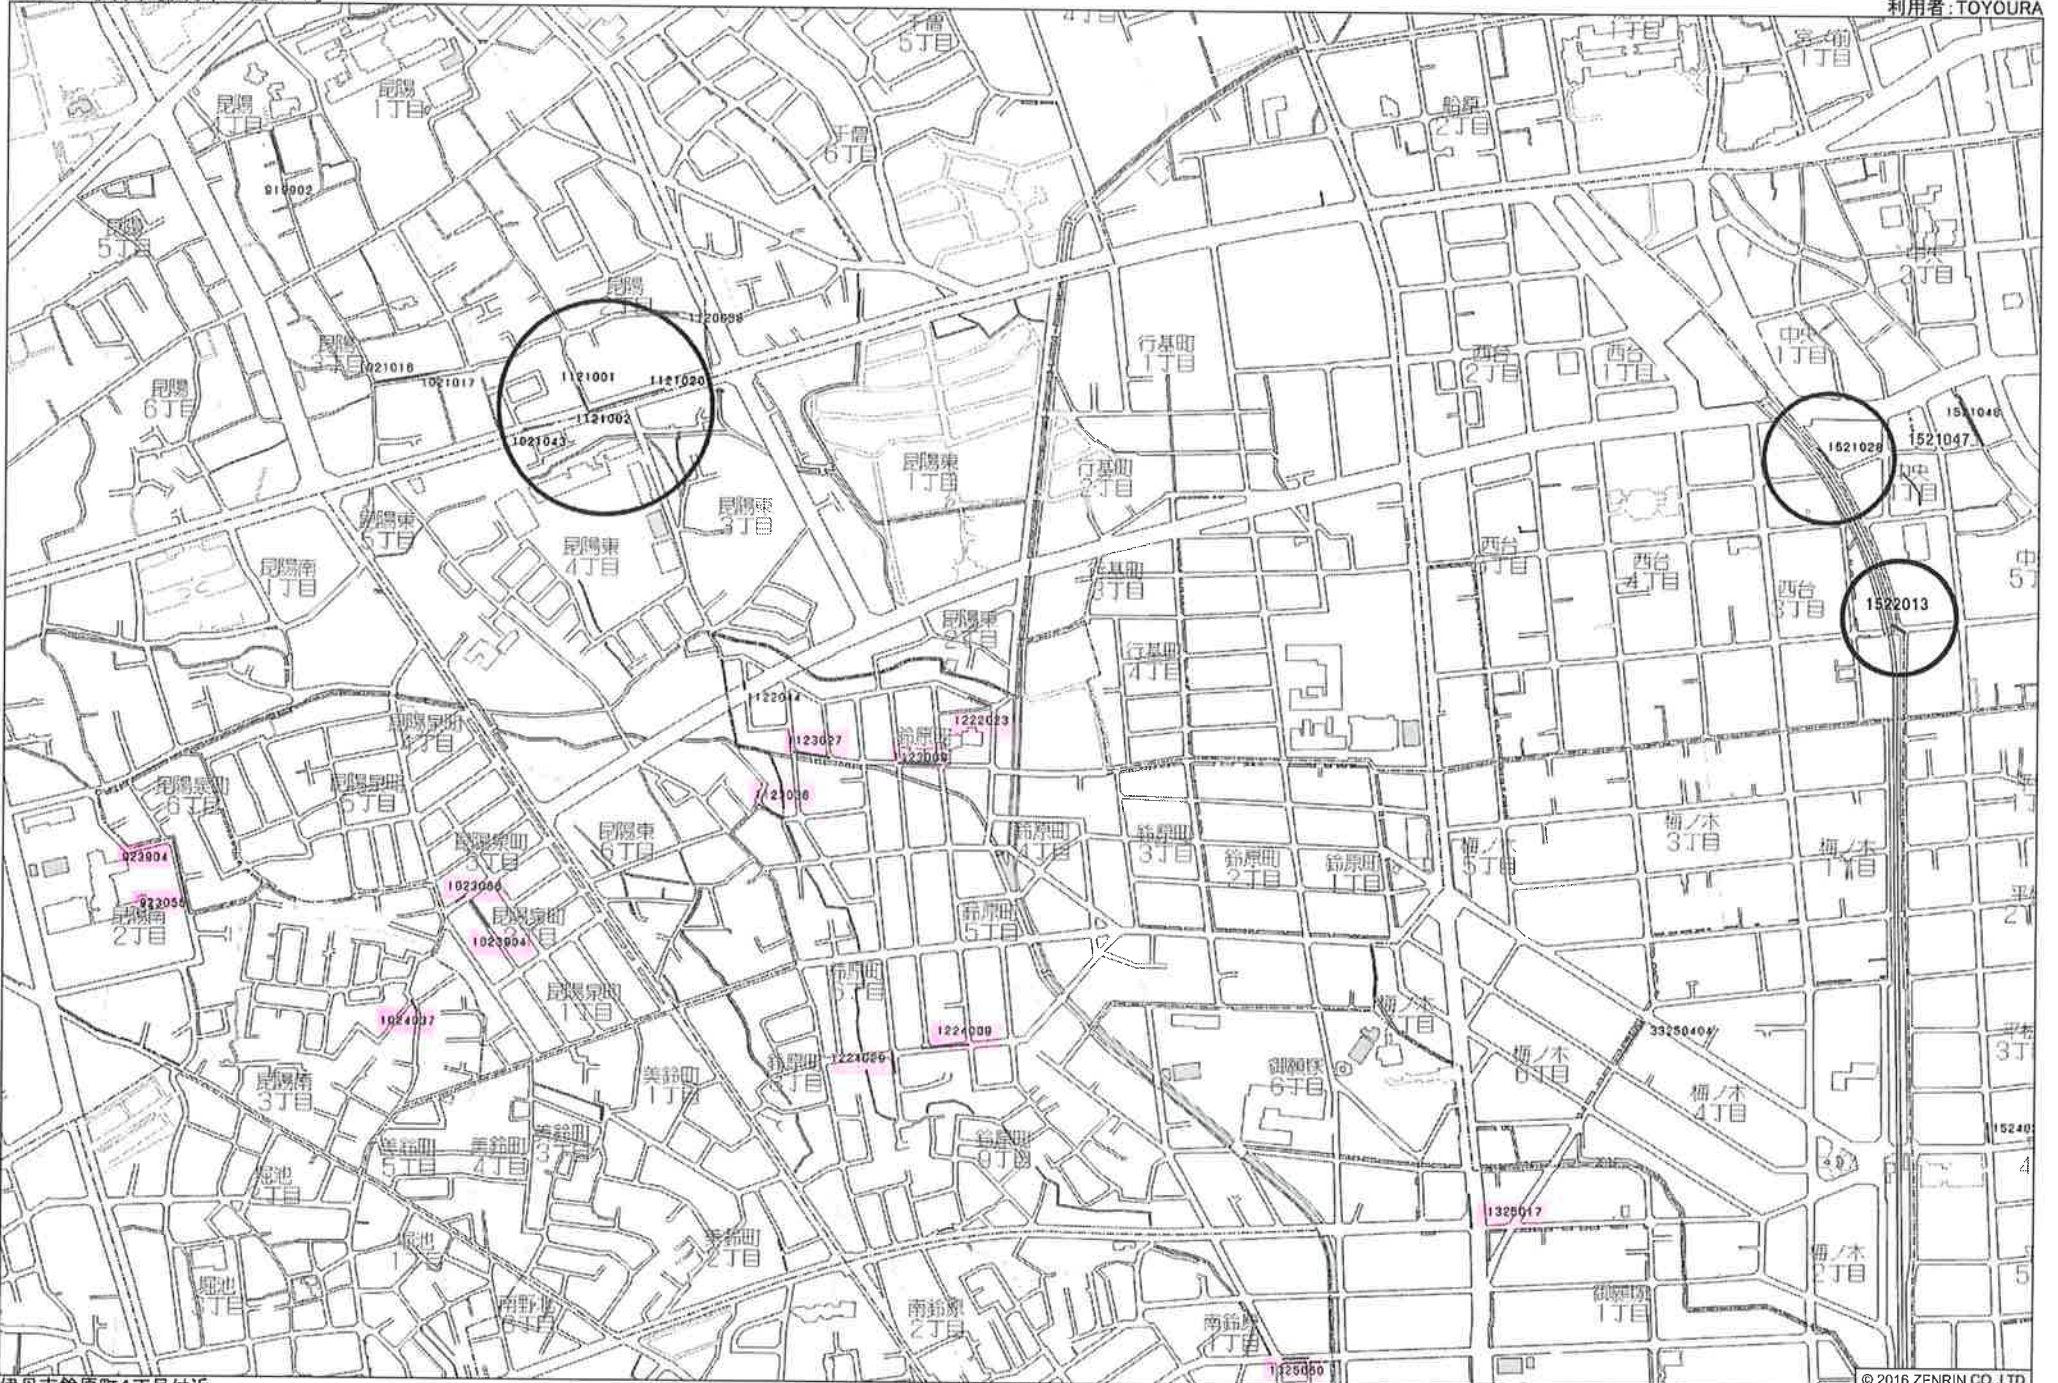

伊丹市鈴原町4丁目付近

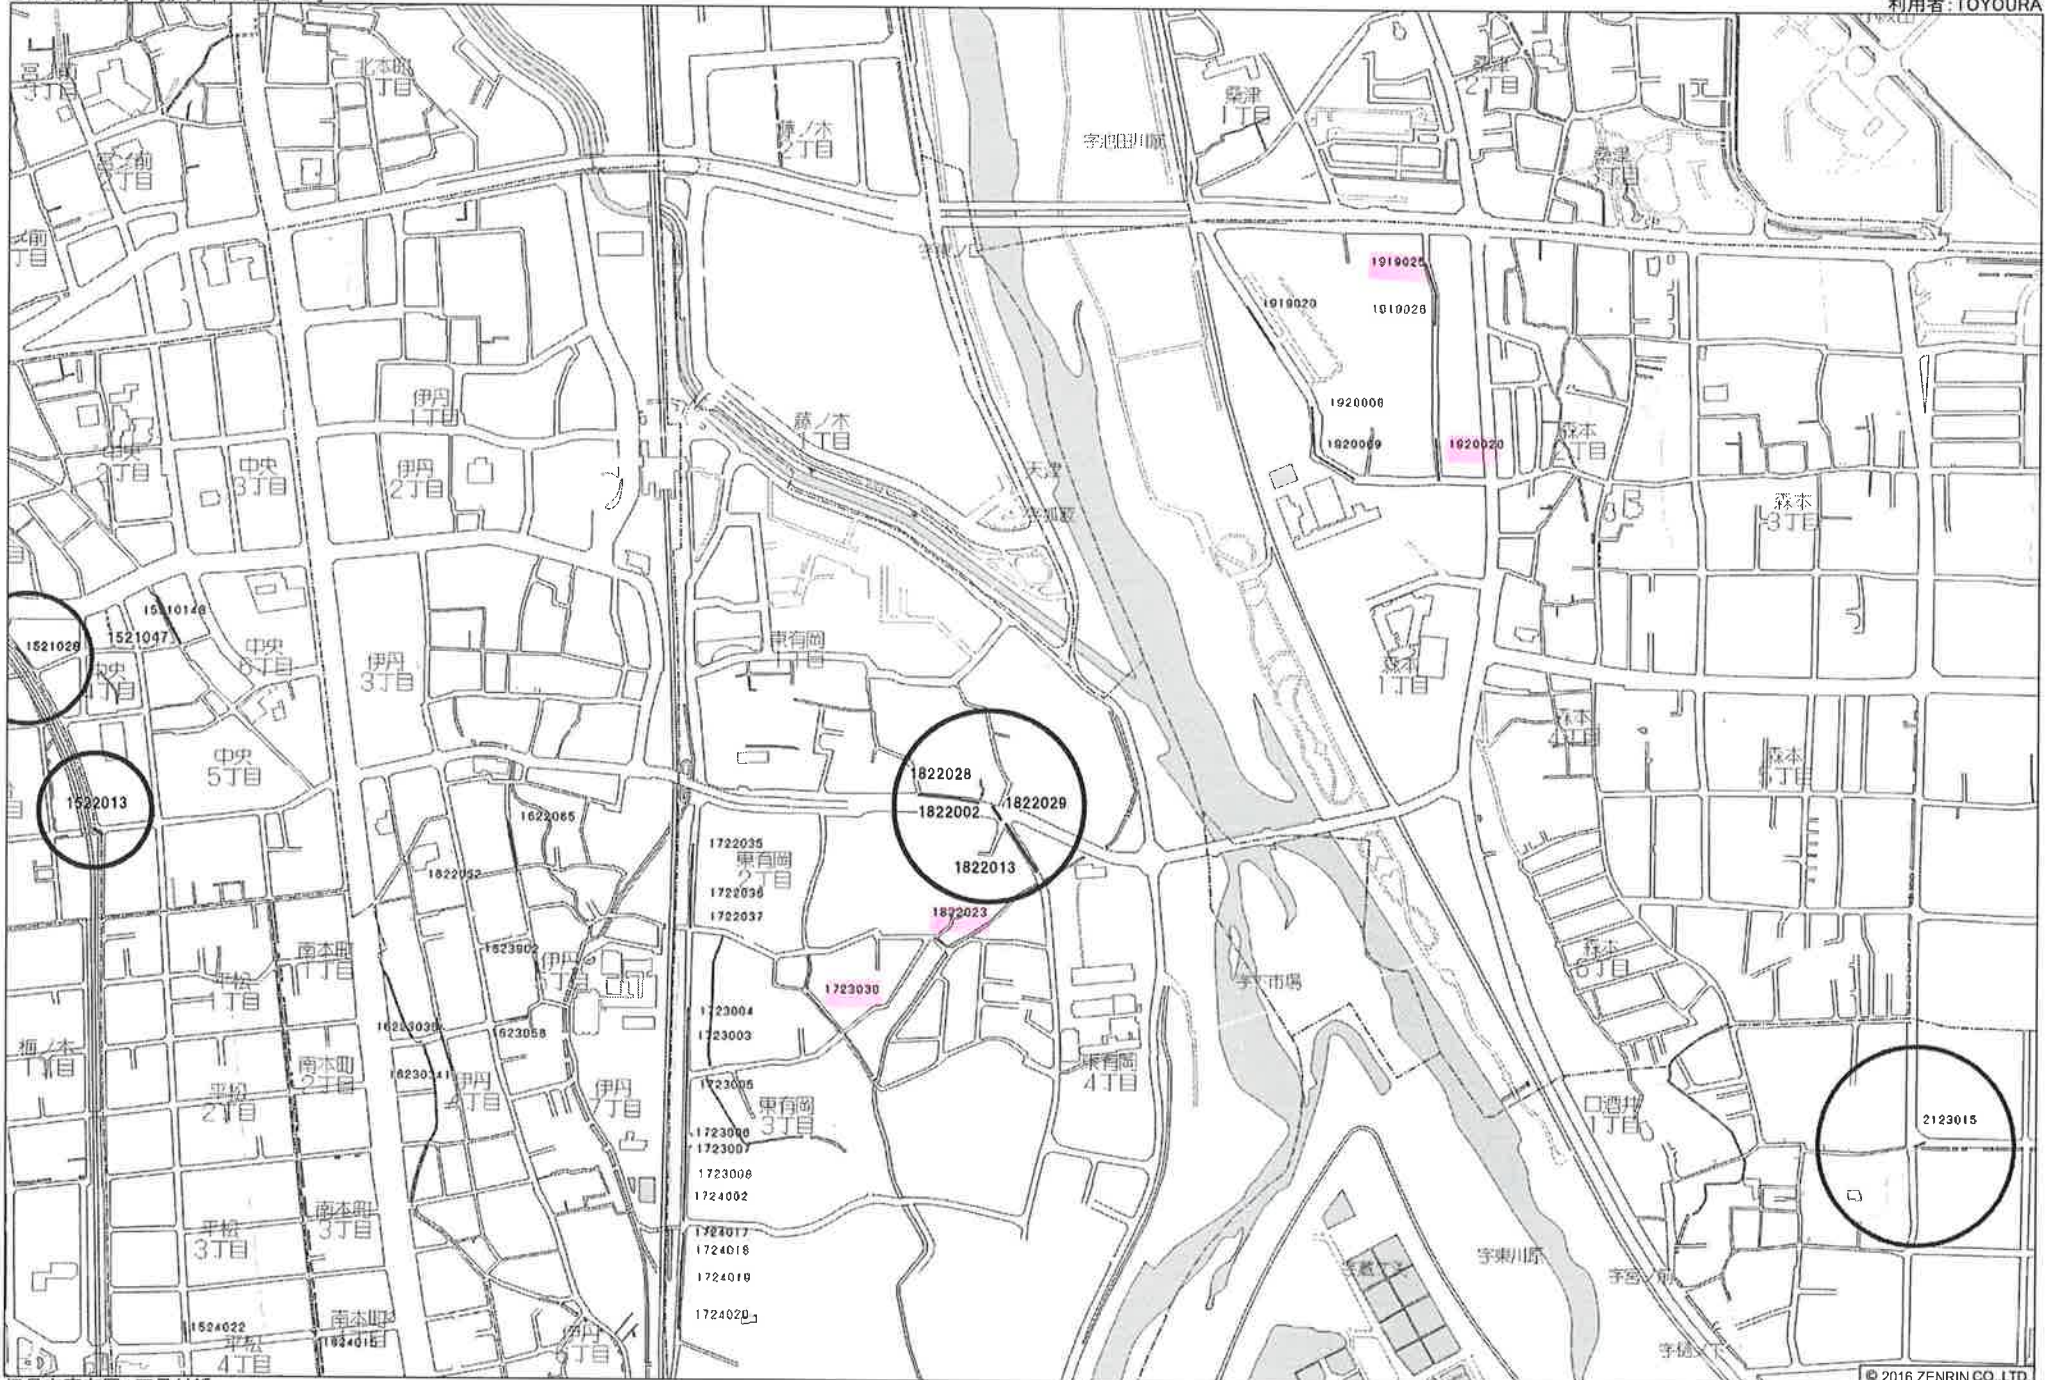

伊丹市東有岡1丁目付近
