

週 間 工 程 表

現 場 代理人	監 理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工 事 名 東有岡地区管渠更生工事


請 負 者 株式会社 神島組

工 期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日

現 場 代 理 人 福島 淳

	(実 施)							(予 定)							備 考
	3月														
	2日 月	3日 火	4日 水	5日 木	6日 金	7日 土	8日 日	9日 月	10日 火	11日 水	12日 木	13日 金	14日 土	15日 日	
施工場所															
本施工		中央 管更生 1521047		東有岡 管更生 1822013											
前処理 後処理 その他	中央 前処理 1521047		東有岡 前処理 1822013		東有岡 後処理 1822013	東有岡 舗装復旧 1822013		中央 後処理 1521047	中央4丁目および中央5丁目 舗装本復旧						

凡例 昼間 施工 夜間 施工

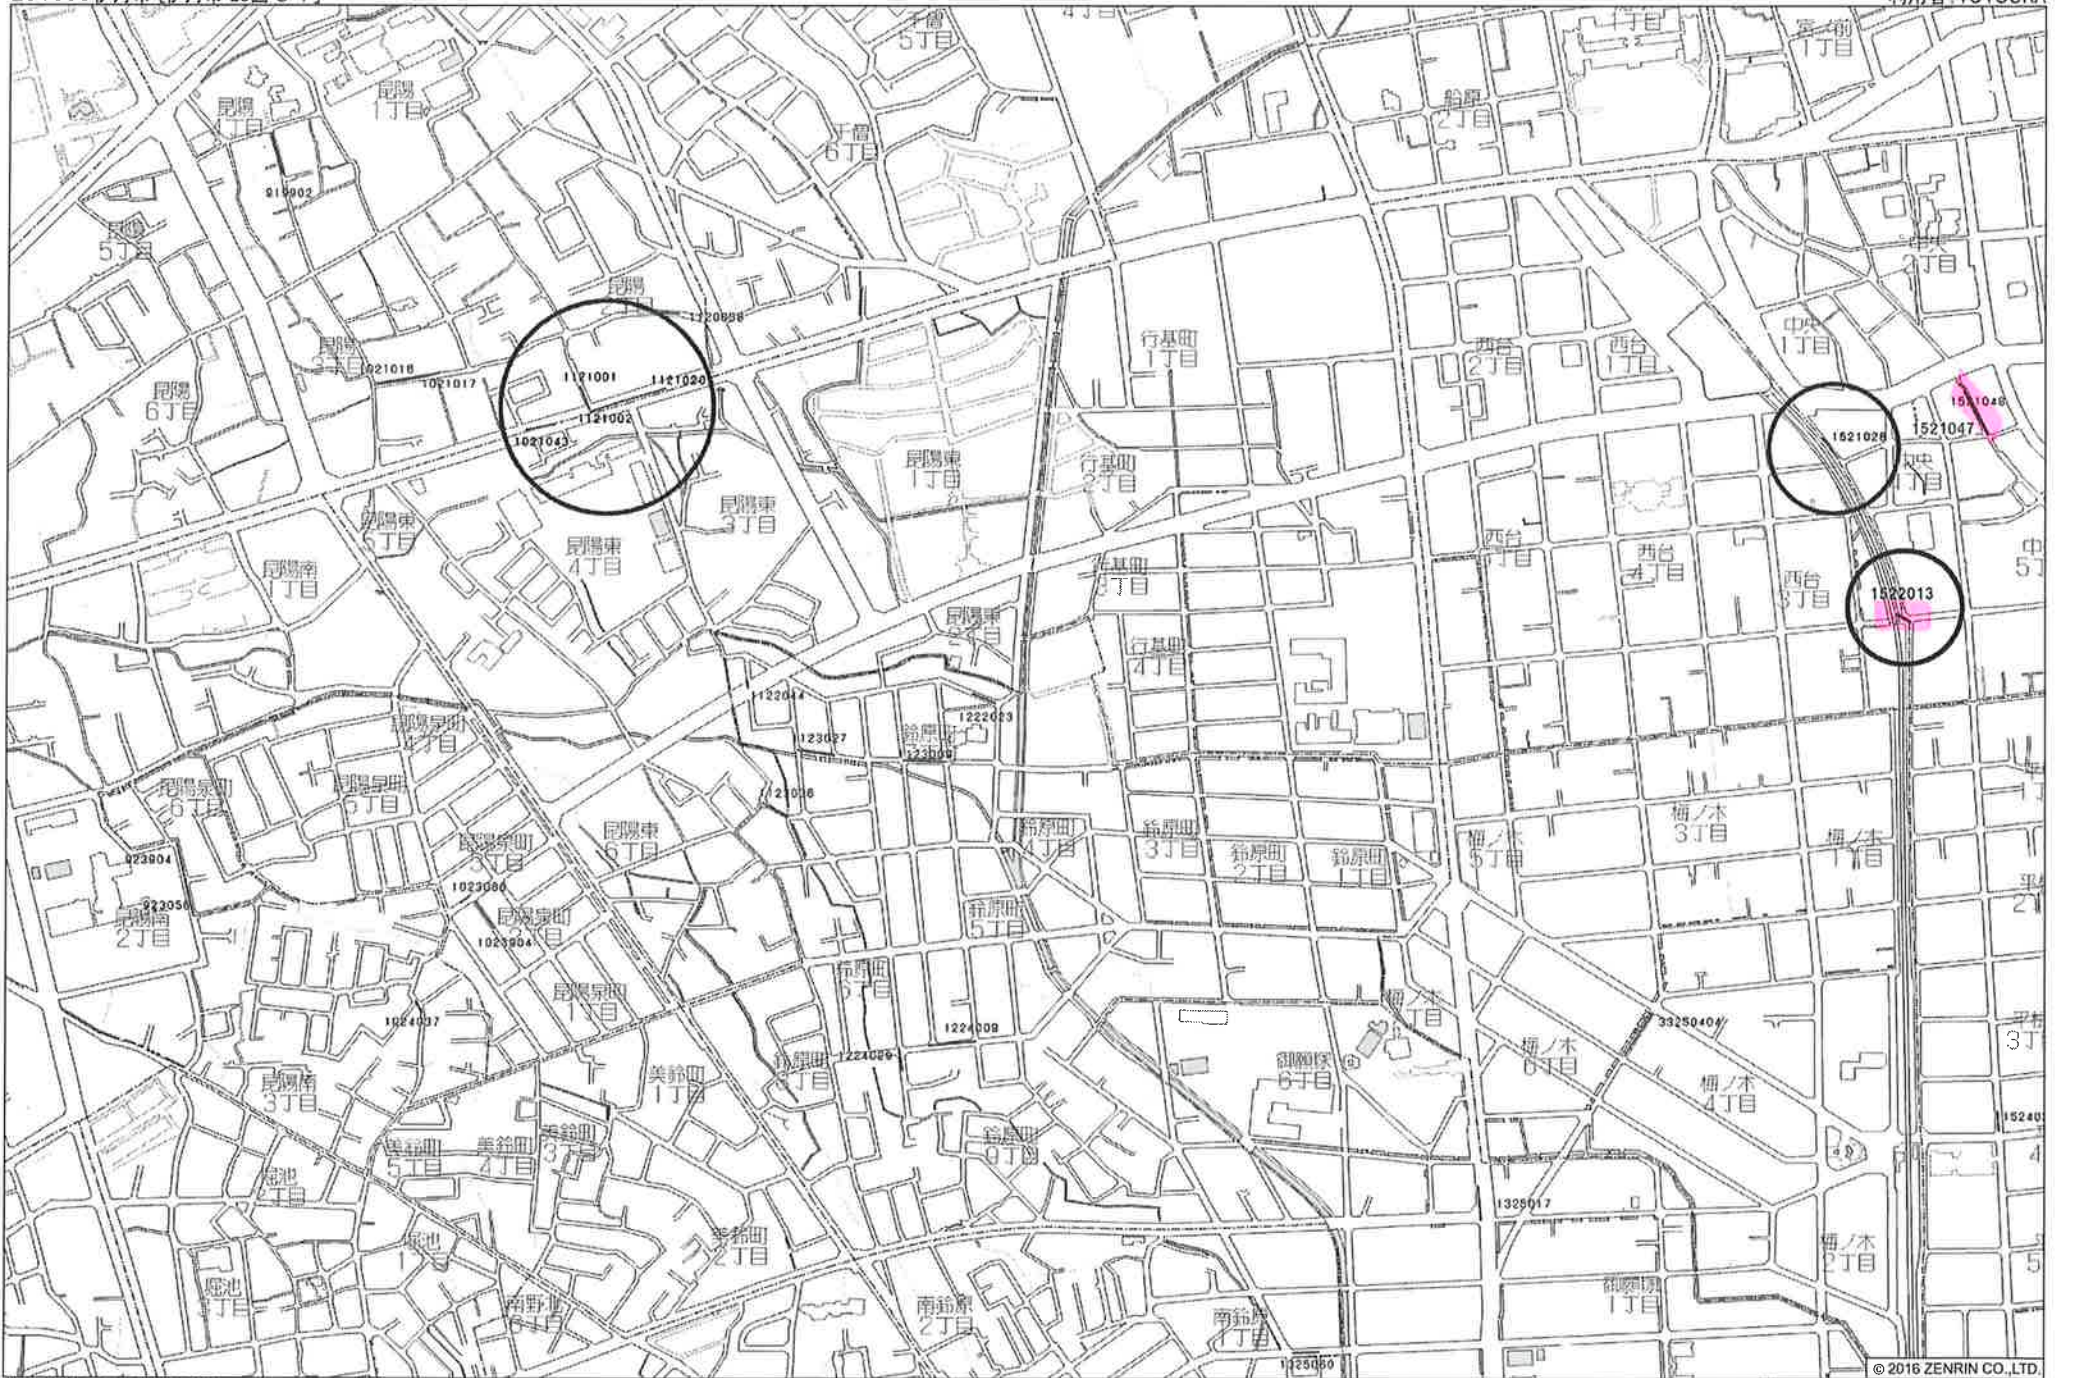

伊丹市鈴原町4丁目付近
